

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse

Københavns Skyttecenter
Selinevej 5
2300 København S

16. august 2018

Sagsnr.
2018-0112752

Dokumentnr.
2018-0112752-8

Tilsynsnotat fra tilsyn den 7. august 2018

Center for Miljøbeskyttelse har d. 7. august 2018 været på tilsyn:

Virksomhed:	Københavns Skyttecenter (KSC)
Adresse:	Selinevej 5, 2300 Kbh S
CVR nr. / P nr.	34 16 38 63 / 1017517739
Deltagere:	Finn Scheibye, Finn Johansen, Henrik Jørgensen og Jan fra KSC Marie Færge og Tina Ginty, Center for Miljøbeskyttelse (CMB)
Virksomheden er:	Omfattet af listepunkt J 203 Udendørs skydebaner ¹ . KSC reguleres efter vilkår meddelt af CMB den 4. april 2014 i "Revurdering af miljøgodkendelse af Københavns Skyttecenter".
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn.
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold, herunder gennemgå de støjdæmpende foranstaltninger, som KSC løbende effektuerer. Støjdæmpning der sikrer at støjreduktionsplanen følges, jf. vilkår 3 i godkendelsen.
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny Jordforurening på tilsynet.
Resultat af seneste egenkontrol:	KSC har den 31. januar 2018 indsendt statusrapport, miljø 2017 med revideret tidsplan, jf. vilkår 19 i godkendelsen.
Konklusion på tilsynet:	KSC effektuerer løbende støjreduktionsplanen ved opsætning af støjsluger, sidevægge mv. jf. vilkår 3 i godkendelsen. Åbningstiden er hele året Mandag til lørdag kl. 8.00 - 20.00 Søn- og helligdage kl. 8.00 - 16.00

Forurenende Virksomhed

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

Mobil
4049 7295

E-mail
E12K@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009809452

¹ Bekendtgørelse nr. 1474 af 12/12/2017 Standardvilkårsbekendtgørelsen

	For bane 0, som bruges af hjemmевærnet, må denne bane benyttes fra 15. august til 31. december. Det blev aftalt at KSC kontakter Hjemmевærnet for annoncering af træningstider og våbentyper jf. vilkår 8 i godkendelsen.
--	---

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres jf. § 12 i tilsynsbekendtgørelsen² senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Danmarks Miljø Administration (DMA) på <https://dma.mst.dk/>.

Miljørisikovurdering af virksomheden

Virksomheden skal vurderes efter den nye bekendtgørelse om miljøtilsyn³, hvor der stilles krav om vurdering af tilsynspligtige virksomheder på baggrund af virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening. Miljørisikovurderingen ligger til grund for bestemmelse af den fremtidige tilsynsfrekvens.

Med venlig hilsen

Tina Ringskou Ginty
miljøsagsbehandler

BILAG 1: Handleplan revideret tidsplan 2018.

² Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1476 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1476 af 12/12/2017

Baggrundsnotat

På tilsynet blev følgende gennemgået:

Drift

På tilsynet blev handlingsplanens punkter gennemgået på de aktuelle skydebaner.

Handlingsplanens punkt 5, 300 m bane: Støjdæmpningen af 300 meter banen forventes påbegyndt i efteråret 2018, hvor der opsættes støjsluger i forlængelse af eksisterende solskærm. Arbejdet er væsentlig forsinket i forhold til oprindelig plan på grund af forhandlinger med udlejer (Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme & Indkøb).




Handlingsplanens punkt 1 og 3, Bane 0: KSC har indgået et tæt samarbejde med rådgivende ingeniørfirma Sweco om opførelse af skærmvæg bag skytter på Bane 0. En løsning der sikrer en tilsvarende eller bedre støjdæmpning end handlingsplanens oprindelige idé om at sænke våbenhøjden på de to baner.

Handlingsplanens punkt 7, indskydning: Arbejdet med at etablere støjsluger i tilknytning til eksisterende halvtag fortsætter året ud.



Handlingsplanens punkt 20, pistolbane 19m og 25m. KSC's støjdæmpning på pistolbanerne er langt mere omfattende end beskrevet i handleplanen. Topblænder over banerne er forhøjet og støjisoleret på begge sider, og støjslugerne fra 2017 er forlænget. Se billeder. Pistolbanerne benyttes i øvrigt flittigt af politiet, som har øget aktiviteterne de seneste år.

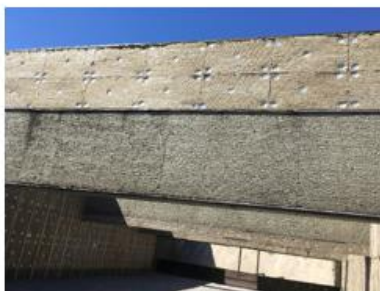

Støj

KSC følger miljøgodkendelsens handleplan for støjreduktion, som forventes tilendebragt 2021. Tidsplanen er revideret, med fremskyndelser såvel som forsinkelser, ift. de enkelte foranstaltninger i handleplanen (Bilag 1).

Ifølge KSC er der sket en stigning i antallet af skydninger i forhold til tidligere. Dette er sket uden at antal og omfang af henvendelser til Kommunen over støjgener er steget.

Luft

Forholdet blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Spildevand

Der udledes kun sanitært spildevand fra stedet.

Tanke

Forholdet blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.



Jord/vand/oplag

Blev der konstateret jordforurening på tilsynet?

☐ ja ☒ Nej

Affaldshåndtering

KCS indsamler, sorterer og afleverer patroner og projektiler, som løbende indsamles fra kuglefang på skydebanerne.



Kvittering for aflevering af metalaffaldet til Hals Metal A/S blev udleveret ved tilsynet. Øvrige kvitteringer for afleveret affald blev ligeledes udleveret.

BILAG 1: Handleplan revideret tidsplan 2018.

Revideret tidsplan med farveangivelse af fremskyndelse (grøn)/forsinkelse (gul).

Foranstaltninger i medfør af miljøgodkendelsen					
Lb #	HP #	Bane nr./beskrivelse skydeafstand	Støjdæmpende foranstaltninger som medfører, at den beregnede maksimale støj højst udgør 62 dB(A) i samtlige beregningspunkter. Bortset fra bane 0, hvor støjen højst udgør 65 dB(A)	Opr. planlagt	Realiseret /planlagt
2	11	8 - 9, 200m	Støjsluser er etableret i tilknytning til eksisterende halvtag	2015	2015
4	14	12, 100m	Skydehus eller L-formet bagskærm 2 m højmax 8m fra standplads. Gennemført ved oplægning af halmballer	2016	2016
6	16	14 – 15, IPSC baner	Skærm på venstre sidevold til 6 m højde. Gennemført ved oplægning af halmballer og forhøjelse af eksisterende vold	2016	2016
5	20	19, 25m pistol	Højre skillevæg på afsnit D forhøjet fra ca. 2,3 m til 5 m over baneplan. Top af skillevæg ca. 0,8 m over eksisterende topblænde.	2016	2016
3	1-4	0, 50, 100, 200 m	Fremover benyttes GV M95 Våbenklasse 3 på alle afstande på HJV-banen. Ingen byggearbejder.	2016	2016
8	17	16, IPSC bane	Venstre sidevold hævet fra 4 m til 5 m over baneplan ved ændret oplægning af eksist. Jord	2017	2017
9	17	16, IPSC bane	2,5 m skærm 10 m bag standplads, fra højre sidevold og 8 m vinkelret ud fra voldfoden. Etableret i tilknytning til eks. containere.	2017	2017
10	20	19, 25m pistol	Vold på højre side af afsnit E forhøjet fra 4 m til 5 m over baneplan med en skærm på den eksisterende sidevold.	2017	2017
11	5	1 - 3, 300m	Etablering af støjsluser i tilknytning til eksisterende solskærm	2017	2018
12	12	10, 75m og frem	Skærm 6 m over baneplan på højre sidevold to.m. 100 m fra sydvold.	2017	2019
13	12	10, 75m og frem	Skærm 7 m over baneplan på venstre sidevold to.m. 75 m fra sydvold.	2017	2019
1	9	6, 100m elgbane	Støjsluser er etableret i tilknytning til eksisterende halvtag	2018	2015
15	1	0, 50m	Maksimal våbenhøjde sænkes til 1,1 m over terræn.	2018	2018
16	3	0, 100m	Maksimal våbenhøjde sænkes til 0,7 m over terræn.	2018	2018
14	7	5, indskydning	Etablering af støjsluser i tilknytning til eksisterende halvtag	2018	2018
20	20	19, 25m pistol	Højre skillevæg på afsnit A0 forhøjes fra ca. 2,3 m til 5m over baneplan. Top af skillevæg ca. 0,8 m over eksisterende topblænde.	2018	2018
18	13	11 - 13, 50m og frem	Skærm på venstre sidevold 6 m over baneplan. Nuværende voldhøjde ca. 4 m.	2018	2020
19	13	11 - 13, 50m og frem	Skærm på højre sidevold på bane 11, 7 m over baneplan to.m. 75 m fra sydvold. Nuværende voldhøjde ca. 4 m.	2018	2020
21	15	13, 100m	Skærm på højre sidevold 6 m over baneplan to.m. 75 m fra sydvold. Nuværende voldhøjde ca. 4 m.	2018	2020
7	16	14 – 15, IPSC baner	Bagskærm hævet fra 3,1 m til 5 m over baneplan. Gennemført ved forhøjelse af eksisterende skillevæg til 50m banen	2019	2017
25	20	19, 25m pistol	Højre skillevæg på afsnit C forhøjes fra ca. 2,3 m til 5m over baneplan. Top af skillevæg ca. 0,8 m over eksisterende topblænde.	2019	2018
24	21	5, 50m og frem	Højre sidevold forhøjes til 4,5 m over baneplan fra skydehus og min. 75 m frem. Nuværende voldhøjde ca. 4 m	2019	2019
23	6	4, 50m vildsvin	Etablering af støjsluser i tilknytning til eksisterende halvtag / solskærm	2019	2019
22	45	43, 100m	Venstre sidevold forhøjes til 4,5 m. Den påtænkte standplads anlægges ikke i h.t. de nuværende planer	2019	2019
26	20	19, 25m pistol	Højre skillevæg på afsnit B forhøjes fra ca. 2,3 m til 5m over baneplan. Top af skillevæg ca. 0,8 m over eksisterende topblænde.	2020	2019
27	20	19, 25m pistol	Højre skillevæg på afsnit A forhøjes fra ca. 2,3 m til 5m over baneplan. Top af skillevæg ca. 0,8 m over eksisterende topblænde.	2021	2020
17	14	12, 100m	Den under lb-nr. 4 anførte løsning ønskes erstattet af et egentligt skydehus, som dæmper lyden bedre end den p.t. gennemførte	N/A	2021
