



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2024 - 8123
Ref. PEMJE/MARBA
Dato: 9. december 2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Randers Affaldsterminal
Virksomhedens adresse	Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ
CVR-nummer	29189668
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	19. november 2025
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn og møde angående asbestdeponering
Varsling af tilsynet	Aftalt den 14. november 2025
Deltagere fra virksomheden	Søren Nysted Svendsen, Randers Affaldsterminal Nicolaj Buch Damgaard, Randers Affaldsterminal Jørgen Niemann Jensen, Randers Affaldsterminal På Teams under mødet: Henrik Kirkegaard, Randers Affald og Genbrug Joanna Cimpu, Sweco
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Peter Møller og Marianne Bager
Tilsynet omfattede	Besigtigelse ved igangværende deponering på Etape 4.2
Materiale udleveret	

Baggrund for mødet og tilsyn

Randers Affaldsterminal har fremsendt redegørelse om den resterende kapacitet til deponering af asbestaffald.

Der er de seneste par år modtaget ekstraordinært store mængder asbestaffald, og i den nuværende situation er der kun omkring 400 m³ tilgængelig restkapacitet tilbage.

På den baggrund har Randers Affaldsterminal anmodet om et møde, hvor mulighederne for at skaffe ekstra kapacitet til mineralsk affald, herunder at udnytte den del af etape 4.2, som endnu ikke er udnyttet, kunne diskuteres. Randers Affaldsterminals oplæg til vurdering af restkapacitet er markeret med grønt på nedenstående figur.




Figur1 Oversigtskort over etape 4.2, enheder til mineralsk affald. Kilde: Randers Affaldsterminal.

Randers Affaldsterminal har været gået i gang med klargøring til etablering af sidevolde af ler (vist med blå på ovenstående tegning) for udnyttelse af den resterende del af den mineralske del af etape 4.2.

Derved har Randers Affaldsterminal konstateret, at den lervold, som skulle udgøre afgrænsningen mellem den ældre etape 4.1 uden tilstrækkelig membran (mod syd) og den nye etape 4.2 med membran, ikke er etableret langs de mineralske enheder på 4.2. Lervolden skulle være ført fra kronen i bunden af enheden med op ad skråningen ind mod etape 4.1, og sikre, at perkolat fra etape 4.2 ikke siver ned på etape 4.1.

Se nedenstående skitse, som viser et snit i overgangen mellem etape 4.1 og 4.2:

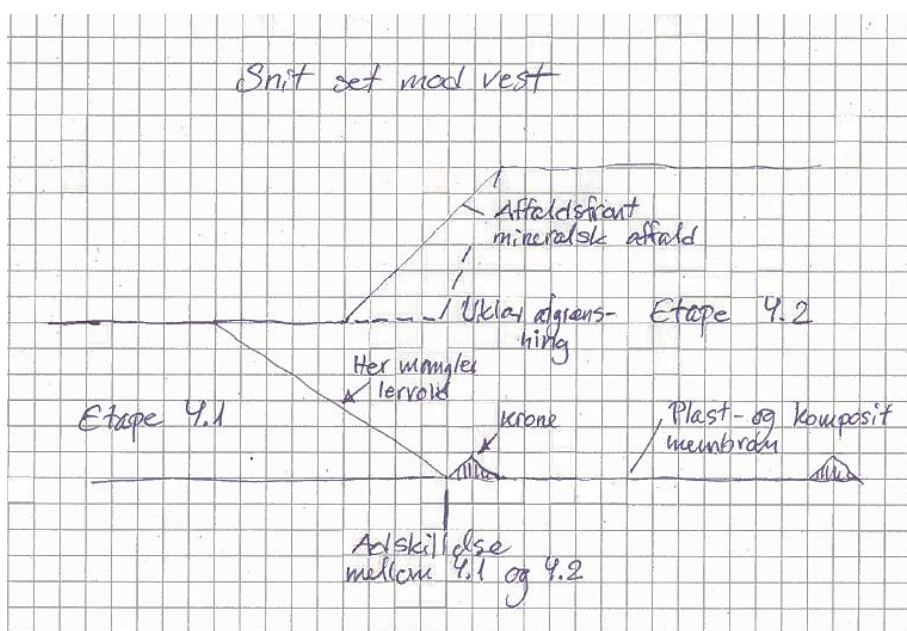

Randers Affaldsterminal vurderer, at der er ca. 10 m fra nuværende terrænniveau ved Etape 4.1 ned til kronen ved bunden af etape 4.2.

Hvis den manglende lervold skal etableres vil der således skulle graves betydelige mængder mineralsk affald væk for at komme ned langs skråningen af etape 4.1, og nå til kronen ved bunden af enheden på etape 4.2.

Status på opfyldning af etape 4.2

På etape 4.2, enheden for blandet affald er indrettet en celle til PCB-affald. Der modtages meget lidt PCB-affald på PCB-cellen, og denne celle vil med den nuværende opfyldningstakt stå tilbage som et hul. Den resterende kapacitet på enheden for blandet affald giver med nuværende opfyldningstakt en restlevetid på 12-15 år.

MST vurderer, at det vil være kompliceret at tilvejebringe reel ny mineralsk kapacitet på den sydlige del af etape 4.2.

Randers Affaldsterminal skal sørge for at sikre en miljømæssig forsvarlig afslutning af den igangværende deponering af mineralsk affald på den sydlige del af etape 4.2 samt at tilpasse allerede deponeret affald over nuværende terræn i området over sydkanten af plastmembranen på etape 4.2.

MST foreslog at opgive overvejelser om yderligere udnyttelse af den beskedne restkapacitet på den sydlige del af de mineralske enheder på etape 4.2, og i stedet etablere asbestceller på enheden for blandet affald og på PCB-cellen på etape 4.2.

Randers Affaldsterminal bør overveje, om det ikke vil være hensigtsmæssigt at tilpasse enheder og celler størrelsesmæssigt på en måde, så den resterende samlede kapacitet på etape 4.2 bliver opfyldt noglunde samtidigt.

Opsummering:

På tilsynet blev aftalt, at Randers Affaldsterminal fremsender en plan for de videre tiltag ved sydsiden af den mineralske enhed på etape 4.2 og om man vælger at etablere asbestceller på enheden for blandet affald og på PCB-cellen på etape 4.2.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Fotos fra tilsyn:



Kig mod nord fra etape 4.1 ind mod den mineralske del af etape 4.2. Den grå brønd er placeret inden for kronekanten på etape 4.2



Kig mod øst med etape 4.2 til venstre, forrest til venstre mineralsk affald og bagerst til venstre blandet affald

Baggrund for mødet og tilsyn

Randers Affaldsterminal har fremsendt redegørelse om den resterende kapacitet til deponering af asbestaffald.

Der er de seneste par år modtaget ekstraordinært store mængder asbestaffald, og i den nuværende situation er der kun omkring 400 m³ tilgængelig restkapacitet tilbage.

På den baggrund har Randers Affaldsterminal anmodet om et møde, hvor mulighederne for at skaffe ekstra kapacitet til mineralsk affald, herunder at udnytte den del af etape 4.2, som endnu ikke er udnyttet, kunne diskuteres.



Randers Affaldsterminal har været gået i gang med klargøring til etablering af sidevolde af ler (vist med blå på ovenstående tegning) for udnyttelse af den resterende del af etape 4.2. Derved har Randers Affaldsterminal konstateret, at den lervold, som skulle udgøre afgrænsningen mellem den ældre etape 4.1 uden tilstrækkelig membran (mod syd) og den nye etape 4.2 med membran, ikke er etableret langs de mineralske enheder på 4.2. Lervolden skulle være ført fra kronen i bunden af enheden med op ad skråningen ind mod etape 4.1, og sikre, at perkolat fra etape 4.2 ikke siver ned på etape 4.1.

Randers Kommune vurderer, at der er ca. 10 m fra nuværende terrænniveau ved Etape 4.1 ned til kronen ved bunden af etape 4.2.

Der vil således skulle graves betydelige mængder mineralsk affald væk for at komme ned langs skråningen af etape 4.1 nå til kronen ved bunden af enheden på etape 4.2 og kunne etablere den manglende lervold.

Status på opfyldning af etape 4.2

Der modtages meget lidt PCB-affald på PCB-cellen på den blandede enhed og denne celle vil med den nuværende opfyldningstakt stå tilbage som et hul. Den resterende kapacitet på enheden for blandet affald giver med nuværende opfyldningstakt en restlevetid på 12-15 år.

MST vurderer, at det vil være kompliceret at tilvejebringe reel ny mineralsk kapacitet på den sydlige del af etape 4.2.

MST foreslog derfor at opgive overvejelser om yderligere udnyttelse af den beskedne restkapacitet på den sydlige del af de mineralske enheder på etape 4.2, og i stedet etablere asbestceller på enheden for blandet affald og på PCB-cellen på etape 4.2.

I den forbindelse bør Randers Affaldsterminal overveje, om det ikke vil være hensigtsmæssigt at tilpasse enheder og celler størrelsesmæssigt på en måde, så den resterende samlede kapacitet på etape 4.2 bliver opfyldt nogenlunde samtidigt.

I den sydlige del af etape 4.2 bør fokus være på at sikre en miljømæssig forsvarlig afslutning af den igangværende deponering af mineralsk affald på den sydlige del af etape 4.2 samt tilpasse allerede deponeret affald over nuværende terræn i området over sydkanten af plastmembranen på etape 4.2.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at Randers Affaldsterminal fremsender en plan for de videre tiltag ved sydsiden af etape 4.2 og om man vælger at etablere asbestceller på enheden for blandet affald og på PCB-cellen på etape 4.2.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.
