




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00101
Ref. Anlh/Soeje
Dato: 16. aug. 2019

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Havbundssedimentdepot - Horsens Havn
Virksomhedens adresse	Del af Ove Jensen Alle 46 A og Ove Jensen Alle 46 C, 8700 Horsens
CVR nummer	34566801
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	Den 13. august 2019
Baggrunden for tilsynet	Nedlukning af delområde A, Etape 2
Varsling af tilsynet	7. august 2019
Deltagere fra virksomheden	Claus Holm Christensen og Michael Rasmussen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Line Højgaard Henriksen
Tilsynet omfattede	Slutafdækning med rene materialer i delområdet
Materiale udleveret	

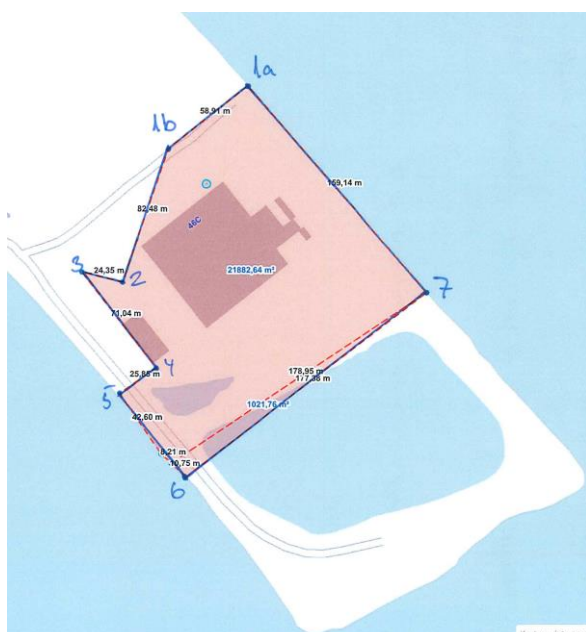

Delområde A på Etape 2 på Havbundssedimentdepot Horsens Havn.

Håndhævelser

Tilsynet har ikke omfattet håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse til opfyldning af et 65.000 m² indspulingsbassin med forurenede materialer fra oprensning af sejltreder og havnebassiner, samt lettere forurenede jord. Horsens Kommune, 1. dec. 2010.
2. Påbud om ændring af vilkår 33 vedr. slutafdækning på Havbundssedimentdepot – Horsens Havn, etape II. Miljøstyrelsen, 26. feb. 2016.

Gennemgang af miljøforhold mht. nedlukning af delområde A, Etape 2

Delområde A, Etape 2 blev besigtiget med henblik på at vurdere om vilkår i påbud fra 2016 er overholdt. Der er i påbuddet stillet vilkår til ”Tykkelse af slutafdækning”, ”dokumentation for ren jord” og ”mængden af jord og rene materialer”.

Følgende områder blev gennemgået:

Areal nordøst for Vittrup Seafoods fabriksbygning

Miljøstyrelsen vurderer i brev den 20. sept. 2018:

”Der er udført boringer med jordanalyser, jf. notat fra Cowi fremsendt den 26. juni 2017. Ud fra analysedata og formodet kote, vurderer Miljøstyrelsen, at nordligt areal + areal med dækningssten er dækket af ca. 50 cm ren jord/dækningssten, og kan betragtes som slutafdækket.”

Græsarealet nordøst for Vittrup Seafood er forlænget forbi bygningen mod sydøst i et mindre område, se foto 1. Der er fremsendt dokumentation for udlægning af sand og harpet muld i dette mindre område. På den baggrund accepteres dokumentationen for slutafdækningen for dette område.



Foto 1. Græsareal forlænget forbi kontorbygning.

Befæstet område vest for Vittrup Seafoods bygning, foto 2.

Miljøstyrelsen vurderer i brev den 20. sept. 2018:

”Der er udført boringer med jordanalyser. Ud fra analysedata og formodet kote, vurderer Miljøstyrelsen, at nordligt areal + areal med dækningssten er dækket af ca. 50 cm ren jord/dækningssten, og kan betragtes som slutafdækket.”



Foto 2. Befæstet område vest for Vittrup Seafoods bygninger.

Området sydøst for Vittrup Seafoods bygning

Der er udlagt sand fra grusgrav på arealet, se foto 3. Slutafdækningen er ikke ført ud på digerene. Der er to steder udført boringer, der viser, at der er udlagt 50 cm sand. Sand fra grusgrav antages at være rent. Der er fremsendt bilag vedr. levering og betaling af sandet (4.021 m³).



Foto 3. Slutafdækning på området sydøst for bygninger.

På tilsynet kunne det konstateres, at sandet ikke gik helt ud til græsarealet, se foto. **Horsens Havn vil snarest muligt udlægge sand og fremsende dokumentation for udlægning på det resterende areal.**

Der er efterfølgende den 15. august 2019 fremsendt dokumentation for udlægning af sand i det resterende areal med en mængde på 111 tons sand.

Arealet under Vittrup Seafoods bygninger

Miljøstyrelsen vurderer i tilsynsrapport af 23. maj 2017:

Mht. slutafdækning under Vittrup Seafood bygningen vurderer Miljøstyrelsen, at ½ m betondæk vil leve op til formålet med slutafdækning, og kan derfor, med

baggrund i, at bygningen allerede er etableret, acceptere at slutfædækningen på det angivne areal udgøres af betondæk.

Diger

Diget på den nordøstlige og sydvestlige side af delområde A er besigtiget og dækket med kampesten, som forudsat i MGK af 2010.

Slutkote

Hosens Havn oplyser, at koten for delområde A ligger på ca. 2,5, som forudsat i Miljøgodkendelsen af 2010. Der er en svag overhøjde på 15 cm i arealet sydøst for bygningerne, som forventes at sætte sig i løbet af kort tid.

Opsummering:

- Tilsynet fandt, at vilkår om nedlukning for delområde A, Etape 2 mht. slutfædækning er overholdt, bortset fra et mindre areal op mod græsarealet. **Hosens Havn vil hurtigst muligt slutfædække dette område og fremsende dokumentation.** *Der er efterfølgende den 15. august 2019 fremsendt dokumentation for udlægning af sand i det resterende areal.*

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.
