

Tilsyn (Basis) på Bavaria Nordic A/S Hejreskovvej 10A, Kvistgård

Dato for tilsynet 14. april 2021 kl. 10:00 – 14:00

Dagsorden

KL	Emne	ansvarlig
10:00 – 10:30	Præsentation, status siden sidst og plan for revurdering	MST / Bavaria Nordic
10:30 – 12:00	Gennemgang af miljøgodkendelsen med ændringer siden revurderingen	MST / Bavaria Nordic
12:30 – 14:00	Fysisk tilsyn med fokus på · Proces flow · Udendørs aktiviteter · Støttefunktioner	Bavaria Nordic
14:00 – 14:30	Opsamling og evaluering.	Alle

Notat fra Tilsyn


Deltagere fra Bavarian Nordic
Anne Krongaard
Rikke Riber

Deltagere fra Miljøstyrelsen
Søren Andersen
Pernille Fibecker

Punkter der blev drøftet i forbindelse med CWW revurdering

1. Støj, ny kommuneplan
2. Bygning 8 bliver en del af CWW revurdering af miljøgodkendelser
3. Nye luftkilder. Luftvilkår afspejler de nye processer. Gamle vilkår som ikke er relevant udtages.
4. Hepa filtre er påsat som ekstra sikkerhed. Vaccine er levende og bliver ikke inaktiveret gennem processen. Men processen er lukket og der er monteret sterilfilter. Rikke Riber skriver et afsnit omkring dette.

5. Spildevandsafsnit
ATS vandbehandlingsanlæg- opsamler spildevand indeholdende A-stoffer. Eks antibiotika. Der sker alene en opsamling, som afhentes til forbrænding.
Miljøpåvirkninger fra anlægget vil være i form af udslip. Men der er sikkerhed i form af dobbeltrør og dobbeltvægget tank, rør og tank er monteret med lekkagedetektor. Rikke Riber skriver et afsnit.
6. Nyt i forhold til BREF. Bavarian Nordic har ikke et iso- certificeret miljøledelsessystem. Men et miljøledelsessystem som vedligeholdes med procedure i henhold til GMP og andre procedurer.
7. Virksomheden læser MGK igennem med henblik på også at se om der skal indtænkes en rummelighed i forhold til nye tiltag i fremtiden.
8. Et afsnit omkring den nyindkøbte nabogrund.
9. Virksomheden spørger til om ansøgning/ anmeldelse i forhold til at tage nye stoffer i brug.

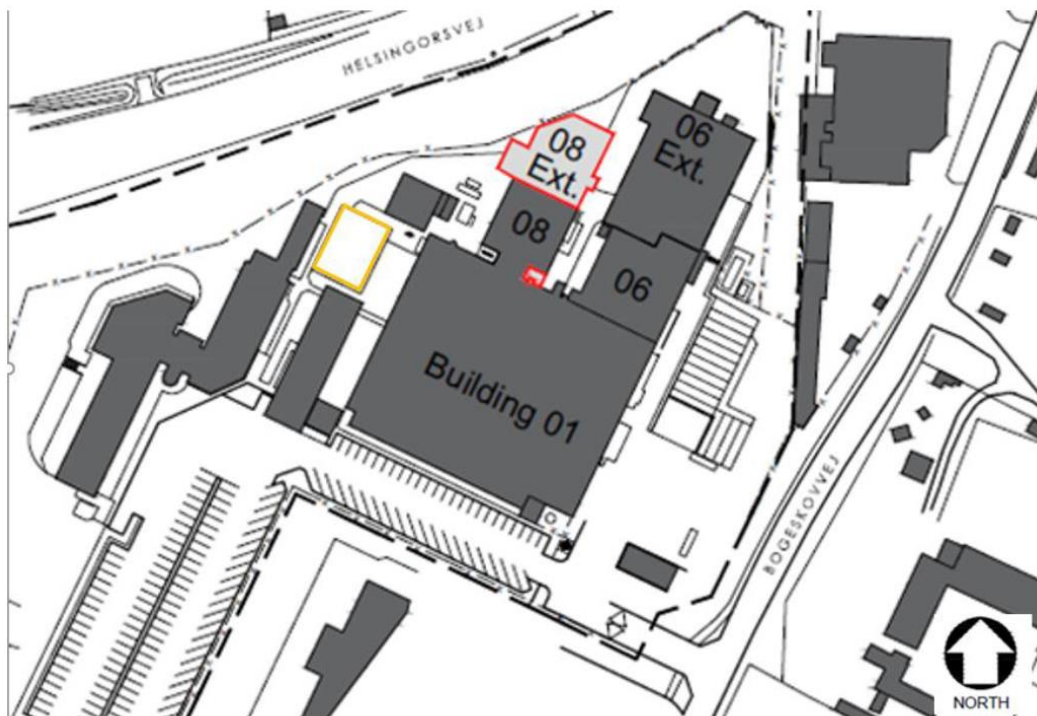

Figur 1 Princip plan. Tilbygningen til bygning 8 (08) er markeret med rødt, eksisterende kølegård er markeret med orange, hvor der vil blive etableret en ny utility-bygning for dampkedel og køleanlæg.

Fysisk tilsyn

Virksomheden indledte tilsynet med en video præsentation af virksomheden som dels forklarede de forskellige internationale opkoblinger og dels forklarede hvordan procesflowet foregår på siden i Kvistgård.

Det fysiske tilsyn var fokuseret på de udendørs aktiviteter i forbindelse med byggeriet af udvidelsen af bygn. 8. Byggeriet er fremskredet og på tilsynet var virksomheden i gang med at placere udstyr indendørs i den nye bygning med henblik på efterfølgende at installere udstyret. Virksomhedens udendørs arealer bar naturligvis præg af de mange byggeaktiviteter der var i proces, men helhedsbillede efterlader en virksomhed med god orden og balance i forhold til den daglige drift.

Specielt fokus på oplagspladsen for affald viser at virksomheden har en strategi om ikke at lade affald blive ophobet på pladsen, men tilstræber en løbende afvikling så mængderne holdes indenfor de planlagte størrelser der er indrettet plads til på oplagspladsen. Hermed opnås en rydelighed og et overblik der giver et godt helhedsindtryk omkring virksomhedens interne affaldslogistik.

Det fysiske tilsyn gav ikke anledning til indskærper.

Opsamling og evaluering

Jf. ovennævnte pkt. 4, 5 og 7, blev det aftalt at virksomheden fremsender supplerende oplysninger Miljøstyrelsen i løbet af uge 15 (denne uge). Herefter vil Miljøstyrelsen færdiggøre udkastet til miljøgodkendelse som herefter sendes i høring hos Virksomheden og Helsingør Kommune parallelt. Høringsperioden sættes til 14 dage hvorefter Miljøstyrelsen vil forholde sig til de tilbagemeldinger der kommer og efterfølgende færdiggøre godkendelsesprocessen med fremsendelse af godkendelsen til virksomheden og offentliggørelse med en 4 ugers klageperiode.
