

Blue Phoenix Denmark A/S (Blue Phoenix Denmark A/S - Herlufmagle)
Suså Landevej 75
4160 Herlufmagle

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886205

naestved@naestved.dk

Dato
16. december 2025

Sagsnr.
25-028175

CVR-nr.
15084790

Sagsbehandler
Jeannie Kristensen
jeakr@naestved.dk

**Opfølgning efter miljøtilsyn på Blue Phoenix Denmark A/S (RGS),
Suså Landevej 75, Herlufmagle**

Næstved Kommune var på basistilsyn hos jer 13. november samt klage tilsyn den 23. oktober 2025 på baggrund af lugtklager fra naboer hovedsageligt i oktober.

Tilsynene gav anledning til følgende bemærkninger:

Kompostplads**Klager over lugt fra kompostpladsen**

Næstved Kommune har i sensommeren og efteråret 2025 fået henvendelse fra 8 naboer, som har registeret/klaget over lugt fra kompostpladsen. Naboerne har fået tilbudt, at Næstved Kommune kunne komme på strakstilsyn, for at vurdere om der var hold i klagen. Dette har dog ikke været muligt at få passet ind, hvorfor Næstved Kommune valgte at fortage et tilsyn med oplaget på pladsen. Der blev ikke konstateret væsentligt lugt fra oplaget ved tilsynet den 23. oktober. Men I oplyste, at I havde modtaget haveparkaffald, der inden modtagelse var påbegyndt omsætning under iltfattige forhold. Dette har givet anledning til afgivelse af sur lugt ved håndtering. I beklager de gener det har givet anledning til, men kunne også oplyse, at kontrakten mht. modtagelse/afsætning af biobrændsel på Selinevej til Vestforbrændingen nu er ændret, så havaffaldet kan blive neddelt ved ankomsten i stedet for at det skulle ligge mindst 14 dage før håndtering og neddeling.

Der blev heller ikke konstateret væsentligt lugtgener ved tilsynet den 13. november, ligesom der ikke er modtaget flere henvendelse om lugt siden midt oktober. Næstved Kommune afslutter sagen om lugt, som værende opstartsproblemer. Vi vurderer, at I nu har fået indkørt kompostpladsen, herunder den nye milevender og får beluftet milerne, så omsætningen sker med tilstrækkelig ilt, og der dermed ikke udvikles stærkt generende



lugt under varmekomposteringen. I har desuden fået ændret betingelserne på for leverancerne fra Selinevej, så det ikke er påbegyndt omsætning inden I modtager det.

I skal eftersende info om jeres håndtering af kompost mm

Næstved Kommune skal have tilsendt den konkrete driftsinstruktion for modtagelse, sortering og behandling af kompost, for pladsen i Herlufmagle, jf. nyt vilkår 4a: Samt plan for håndtering af eventuelle lugtgener, jf. vilkår 6, herunder hvornår I f.eks. vil overdække /vande miler.

Vi har også behov for en opdateret/forbedret journal mht. dato for oplægning i milen samt eftermodning, og hvilke partier der indgår i mile-/koldkomposteringen på de forskellige miler. Det sidste forudsætter forventeligt flytbare skilte eller andet identificeringssystem til miler på pladsen.

I har registeret vendinger og temperatur i milen, men mangler angivelse af temperaturmålinger pr. minimum 2,5 løbende meter. F.eks. af højeste og laveste temperatur i milen eller om I i stedet regner på gennemsnittet af målinger pr. mile?

I skal også eftersende analyse for det opsamlede perkolat og pladsvand, når de foreligger. I oplyste, dog, at der på tilsynstidspunktet endnu ikke var udtaget prøver.

Opfølgning

Vi aftalte, at ny driftleder på stedet får tid til udformning af forbedret journalark/system, hvorfor overstående data/procedure skal være **modtaget senest 1. marts 2026**. Journal kan f.eks. dække over de første to uger af februar eller tilsvarende.

Opsamling af andet pladsvand

I har i forbindelse med etableringen af kompostpladsen også søgt fremadrettet om at opsamle pladsvand for andet udendørs affaldsoplag samt kørearealer, så det ikke længere udledes til branddammen (§3 fredet sø). På tilsynet blev det konstateret, at de to ekstra tanke til opsamling af øvrigt pladsvand var etableret. Desuden var affaldsoplaget blevet reduceret væsentligt på udearealet, så det er muligt for entreprenør at komme til at udskille/ omlægge afledningen af tag- og pladsvandet på den øvrige del. I oplyste dog, at I ikke når det inden nytår, som fastsat i vilkår 36, men at entreprenøren står klar til at gå i gang.



I skal inden den 15. januar 2026 have fremsendt en opdateret afløbsplan for hele virksomheden samt tidsplan for udførsel. Herunder hvornår I forventer af have opsamlingen af øvrige pladsvand klar og opfylder vilkår 36.

Belægning:

Definitioner mht. til krav til belægningen

I har ønsket at få fastsat en yderligere definition i forhold til krav til belægningstype. F.eks. skal de daglige køre arealer ved håndtering af have- park affald, jf. vilkår 50 være befæstede, hvor imod oplag til haveaffald, skal være tæt (impermeabel) belægning.

Næstved Kommune henholder sig til definitioner fastsat i bekendtgørelsen for standardvilkår, som også er beskrevet i bilag 3.

Belægning i hal

I har i mail før tilsynet oplyst, at hallen med mineraluld (den, der tidligere blev anvendt til MGP-fraktionen) er med asfalt. Det er dog tydeligt på fotos med mineraluld, at belægning i denne del af hallen er med belægningssten, og dermed ikke umiddelbart kan vurderes at være tæt, men befæstet, dog overdækket.

Belægning under biobrændsel

I har spurgt, om den faste fraktion af haveaffald må opbevares direkte på jorden eller tilsvarende belægning. I den forbindelse har I fremsendt en godkendelse fra en af jeres pladser, hvor der er givet tilladelse til oplag af stubbe og trærødder på grus.

Næstved Kommune kan ikke umiddelbart acceptere aflæsning af træstød på grus. Når materialet skal flises, skal det som minimum placeres på fast belægning, så alt kan opsamles, og der kan ske kontrolleret afledning af overfladevand. Svarende til standardvilkår for bygningstræ. Neddelt have- og parkaffald kan forurene underliggende jord med næringsstoffer, hvis det år efter år ligger samme sted på en permeabel belægning eller direkte på jorden.



Hvem leverer henholdsvis mineraluld og vinduesrammer til pladsen?

. Næstved Kommune har behov for at få afklaret, hvorfra I modtager affaldet for at kunne vurdere om fraktioner er farligt:

- Mineraluld produceret før 1997 er farligt affald.
- Vinduesrammer m/glas produceret mellem 1950-1977 er ofte monteret med PCB-holdigfuge og KAN være farligt affald.

Derfor har vi behov for at vide, hvorfra I har modtaget jeres oplag af henholdsvis vinduesrammer m/glas og mineraluld. Det kan være i form af faktura til kunder, eller andet, som viser hvem der har leveret dette affaldet i f.eks. 2025. I skal fremsende oplysningerne **seneste den 15. januar 2026**

Ansøgte ændringer

Virksomheden har den 7. november 2019 (med senere ændringer) indsendt ansøgning om ny/ændret godkendelse mht. øgede mængder/herunder fleksibilitet i placering af affaldstyper samt modtagelse af jord til kartering.

Samt nye affaldstyper som f.eks.:

- Dæk
- Affald fra markedspladser
- Gips
- Isolationsmateriale, nu også som farligt affald.
- Blandet affald
- Termoruder
- Ballast fra banespor (uden for stationsområder).
- Jord, sand og sten

Virksomheden oplyser at der søges maksimal kapacitet for modtagelse af affald på 200.000 ton/år, mens den maksimale oplagskapacitet er 75.000 ton. Det var før ansøgning og miljøgodkendelse til kompostering.

**Oplagsmængde, sammenskrivning fra miljøgodkendelser**

Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsarter i de angivne mængder, medmindre andet er nævnt:

Fraktion	EAK kode	Modtaget (ton/år)	Max lager (ton)
Beton	17 01 01	40.000	10.000
Asfalt	17 03 02	20.000	5.000
Tegl	17 01 02	10.000	2.500
Træ	17 02 01	10.000	2.000
Elmaster	17 02 03	500	500
Haveaffald til kompostering	20 02 01	60.000	120.000
Rødder og grene til flisning	20 02 00		
Ren jord og brokker	17 07 01	30.000	8.000
Blandet bygningsaffald	17 07 1	3.000	1.000
Genanvendeligt affald til presning		400	50
Frasorteret affald	Modtages kun med andet affald		50
Forurenet overskudsjord	Modtages kun med brokker, mursten og beton		90
Byggematerialer forurenet med PCB (Tillæg 2014)	5000		5000
Kommunalt husstandsindsamlet emballage: Blandet metal, glas og plast (Tillæg fra 2019)			500
I alt			Ca 155.000



Fri anvendelse af pladsen, indretning og placering af fraktioner og støjede aktiviteter

I ønsker en fleksibel anvendelse af pladsen. Det vurderes dog, at det vil være vanskeligt at opfylde både krav til støj, separat opsamling af overfladevand fra henholdsvis have-/parkaffald og byggeaffald samt krav til belægning, uden at der sker en væsentlig tilpasning af pladsens indretning.

Krav til belægning og separat opsamling af pladsvand

Næstved kommune har skitseret nuværende og forventet nye krav til belægning i kombination med krav til adskillelse af pladsvandet i bilag 4. Daglige kørearealer på hele pladsen skal være befæstede med fast belægning, hvis Næstved Kommune skal kunne acceptere, at hele eller mere af jeres plads frit kan anvendes til oplag af have-/parkaffald, jf. vilkår 53.

I kan også forvente, at Næstved Kommune stiller krav om at bygningstræ fremover skal opbevares på fast belægning, jf. standardvilkårene.

Næstved Kommune kan ikke efterkomme jeres ønske om at oplag af biobrændsel kan oplagres på permeabelt underlag under og efter flisning, men kan muligvis godkende af stød og rødde og stammer uden grønt kan aflæsses og opbevares på fast belægning, tilsvarende standardvilkår til bygningstræ.

Opsamlet pladsvand fra kompost med næringsstoffer skal holdes adskilt fra øvrige pladsvand fra byggeaffald mm, som evt. indeholder tungmetaller. Da det næringsrige vand ikke skal fortyndes/forurenes med evt. tungmetaller i forhold til vanding af miler osv.

Hvis I ønsker, at anvendelse af pladsen skal være mere fleksibel, skal I forholde jer til at overfladevandet fra kompost holdes adskilt fra det øvrige pladsvand andet steds på grunden. Lige som pladsvand fra oplag af endnu ikke karteret jord skal opsamles via olieudskillere.

Støj, herunder støjafskærmning.

Støjvolden ved kompostpladsen er under udførsel. Pt. sker der dog ikke neddeling af haveaffald på pladsen.

I havde på tilsynet endnu ikke opsat støjskærm ved nedknuser til knusning af beton mm. Hvis I ønsker fri benyttelse af pladsen til forskellige aktiviteter, skal I fremsende en ny støjberegning, som beviser, at knusning af beton, neddeling af haveaffald/bygningstræ og sortering af



jord, vending af miler mm kan ske andet sted/andre steder på grunden end de nuværende placeringer og under hvilke forudsætninger.

Alt i alt kræver en fleksibilitet, at der redegøres for, hvor på grunden støjende aktivitet kan foregå og under hvilke betingelser.

I skal inden næste nedknusning af byggeaffald opsætte støjskærmen ved knuser eller indsende nye støjberegning, som viser, at I kan foretage nedknusning andre steder på jeres plads og stadig overholde støjgrænser til naboer.

Opsummering på "fri" anvendelse af pladsen

Hvis I fremover ønsker størst mulig fleksibilitet i anvendelsen af pladsen, skal der fremsendes en opdateret kloak- og befæstelsesplan samt en ny støjredegørelse.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling².

Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³.

Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes. På jeres virksomhed er det Miljøstyrelsen, som er myndighed på affaldstilsynet og de vil kontakte jer for an aftale om styrket affaldstilsyn.

Faktura for miljøtilsyn

I vil modtage en faktura for tilsynet.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.



Jeres bemærkninger

Hvis I har bemærkninger, skal I sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte Jeannie Kristensen på telefon +4555886205 eller mail jeakr@naestved.dk. Mens spørgsmål omhandlende kompost og pladsvand skal stilles til Julie Lindberg på mail jufli@naestved.dk eller telefon 55 88 62 09

Med venlig hilsen

Jeannie Kristensen
Miljøtekniker

Bilag:

Tilsynsrapport fra 13/11

Tilsynsrapport fra 23/10 2025

Bilag 3: Definition af belægning

Bilag 4: Forventet krav til belægning og overfladevand ved oplag

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse.	(RGS), Suså Landevej 75, 4160, Herlufmagle
CVR nr. / P-nr.	15084790/1014175233
Virksomhedstyper	5.3 b i" biologisk behandling større end 50 tons pr. dag (kompostdelen) og 5.3 ii For behandling af affald med henblik på forbrænding (biobrændsel), Oprindelig godkendelse efter K206, på bilag 2 Sortering af MGP K212 på bilag 2 PCB: bilag 1, punkt 5.1 <i>Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår en eller flere af følgende aktiviteter:</i> <i>b) Fysisk-kemisk behandling.</i>
Tilsynsdato	13. november 2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Oplag af affald og belægning på virksomheden samt kompostpladsen.
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Hvad gælder for virksomheden:

- Miljøgodkendelse til modtagelse og udsortering af blandet bygningsaffald, herunder nedknusning af beton og tegl samt glas mm. fra 2007.
- Revideret vilkår fra klagenævnsafgørelsen 2010
- Tillæg fra 2014 til modtagelse og neddeling af PCB-holdigt affald.
- Tillæg fra 2019 til sortering af metal, glas og plast forud for videre behandling.
- Tillæg til kompostplads og opsamling af pladsvand fra februar 2024.

**Tilstede ved tilsynet var:**

Fra Blue Phoenix Denmark: Louise Sorgenfrei, Jens Arre Nord, Jens Nissen, Dennis Sørensen samt Chris Bagger, som overtager driftsledelsen af pladsen fra 1/12.

Og fra Næstved Kommune deltog Julie F. Lindberg og Jeannie Kristensen.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Virksomhedens aktiviteter:**

Virksomheden er indrettet og drives som en erhvervsaffalds genbrugsplads med modtagelse og behandling af følgende affaldstyper: (inden videre disponering): Ren jord, PVC, tegl/mursten, træ, beton, stenuld, sanitet, og PCB-forurenede vinduer/døre.

Pt. Koncentrerer virksomheden sig om kompostering og modtagelse og behandling af træ og beton, tegl og sten

Indretning og drift:

- Siden sidst er der gamle landbrugsejendom, samt andre sidebygninger/haller er revet ned.
- Kompostpladsen er etableret færdig over sommeren 2025.
- Oplag bestod hovedsageligt af nedknust bygningstræ, vinduesglas, nedknus beton/tegl samt mindre mængde isolering, jf. efterfølgende beskrivelse.
- Jordmodtagelse mm er sat på pause siden januar.
- Der er brovægt til ind og udvejning af affaldsmængder.
- Der er ikke umiddelbare planer om at inddrage det uudnyttede areal mod vest.

Affald:Sveller, elmaster, isolering og knust asfalt:

I hallen, hvor der tidligere var sortering af MGP affald, er der nu opbevaring af trykimprægneret træ (sveller og elmaster) og i den anden ende fortsat oplag af isolering.

Knust asfalt opbevares under tag i en af de mindre bygninger.

Område til opbevaring og neddeling af affaldstræ

Oplag af neddelt affaldstræ, sker på ikke befæstede arealer.

Opbevaring og neddeling af beton, tegl og mursten



Disse oplag og aktiviteter sker på et underlag af knuste bygningsmaterialer. I det det er inert affald, opfylder det også standardvilkår ved den kommende revision af miljøgodkendelsen.

Andet affald

Diverse mindre oplag af sorteret affald, f.eks. dæk, store sten osv, som lå op mod virksomhedens afgrænsning mod nord, på et underlag, som består af sammenkørte knuste materialer. Frasorteret jern opbevares i container.

Kompost

- Kompostpladsen var fuld belagt med miler på tæt belægning med opsamling til to tanke.
- Miler blev vurderet til at indeholde tilstrækkeligt struktur materiale og var tilpas fugtige på tilsynstidspunktet.
- Der sker pt. ikke ske neddeling af haveaffald på pladsen. Når der modtages neddelt materiale fra Selinevej, vil der blive taget haveaffald/kompost med retur.
- Der var på tilsynstidspunktet en mindre bunke haveaffald uden for kompostpladsen.
- Der var oplagt eftermodningsmiler i ca. 7 meters højde, som var overdækket på den tidligere jordplads. Der er endnu ikke etableret opsamling af overfladevand fra denne, som pt. udledes til vandhul via sandfang og udskiller.

Mængder

- Oplagsmængder på den øvrige plads var reduceret ned til et minimum pga. kommende omlægning/etablering af regnsvandsafledningen, hvorfor mængder her ikke blev gennemgået.

Drifttid:

- Genbrugspladsen har aktiviteter inden for normal arbejdstid på hverdage.
- Enkelte transportører har dog adgang til aflæsning uden for normal arbejdstid.
- Vending af kompostmiler sker normalt mandag og torsdag i dagperioden og var ca. 5 timer.

Støj:

- Til- og frakørsel
- Knusning af træ og beton/tegl



- Støjskærm ved knuser er endnu ikke opsat. Det blev oplyst, at der bestilles knuser til pladsen 4 gange om året.
- Støjskærm ved "jordpladsen" er blevet etableret.
- Støjvolden ved kompostpladsen er endnu ikke færdig etableret, men påbegyndt.
- Neddeling af haveaffald sker pt. på Selinevej.

Luftforurening:

- Miler ligger i 2,50 meter høje samt 125 meter lange miler, som vendes 2 gange om ugen, hvor der kan ses vanddampe (se fotos for maskine mm).
- Ved ankomst var der ingen aktivitet på kompostpladsen. I vindsiden var der ligesom sidst en begrænset humuslugt tæt ved.
- Vending blev sat i gang ca. kl. 11. Der blev kort efter vending i frokostpausen konstateret lidt mere kompostlugt tæt ved, men yderst begrænset (ingen skarp eller sur lugt).
- Der er indkøbt vandingsmaskine mhp. begrænsning af støv samt befugtning af miler.

Spildevand:

- Tanke til opsamling af perkolat og pladsvand fra kompostpladsen var etableret.
- Det sammen var de to tanke til opsamling af det øvrige pladsvand.
- Etablering af afvanding /opsamling, af virksomhedens øvrige pladsvand er blevet forsinket. Entreprenør forventer at gå i gang inden jul.
- Der er endnu ikke taget prøver af opsamlet perkolat og pladsvand og derfor heller endnu været behov for afsætning/forbrug. Lige efter asfaltering vil der muligvis være afgivelse af PAH i det opsamlet pladsvand, og vil derfor ikke være retvisende for efterfølgende prøver.
- Alam til opsamlingstanke er ankommet, men endnu ikke opsat.

Journal:

- Der var inden tilsynet indsendt journal for modtagelse af haveaffald.

Tanke:

I hal på tæt belægning er placeret:

- 1000 liter palletank med pumpe til ad blue.



- Entreprenør tank sidst godkendt 9/23 efter transport om farligt gods på vej (ADR). Dvs. skal kontrolleres inden udgangen af marts 2026, med 30 mdr. kontrolinterval.
- Desuden typegodkendt tank på 3999 liter fra 2021, som dog er indbygget som en entreprenørtank. Denne må kun flyttes, når den er tom, da ADS-regler kun gælder op til 3000 liter.

Miljøledelse:

- Virksomheden har udarbejdet et overordnet miljøledelsessystem, som gælder for hele RGS; nu Blue Phoniex. Alle lokationer er ISO 14001 godkendt og skal recertificeres i maj 26.

Jordforurening:

- Der er ansøgt om § 8 tilladelse til etablering af ledninger til opsamling af overfladevand, da det meste af grunden er V1/v2 kortlagt.
- Jord anvendt til jordvolden er anmeldt ca. 7.000 tons via jordweb, som ren jord

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Virksomheden får opdateret støjrapport mht. skøjskærm mm., når det kun er nedknusning ca. 4 gang om året og vending, nedknusning af haveaffald, skal kunne ske over alt, hvor der bliver etableret fast tæt belægning. Herunder sortering fra jordpladsen, som nedlægges/sættes i bero pt.
- Have affald, skal opbevares på tæt belægning, hvilket grus belægning ikke opfylder, hvorfor virksomheden ønsker definition af belægningstyper.
- Analyser for opsamlet pladsvand fra kompostpladsen eftersendes
- Opdateret afløbsplan for den øvrige plads med tidsplan for udførsel. Samt opdateret afløbsplan for kompostpladsen eftersendes
- Forbedret journal system skal være fremsendt til Næstved Kommune senest 1/3 2026.
- Driftsinstruks for stedets affaldsmodtagelse og sortering skal eftersendes sammen med stedets plan for håndtering af lugtklager.

Bilag:


- Journal over håndtering af kompost var fremsendt på forhånd

- Samt ønske om ændret/udvidelse af areal til oplag af haveaffald/kompost

Fotos:



Pladsen, hvor der tidligere lå jord

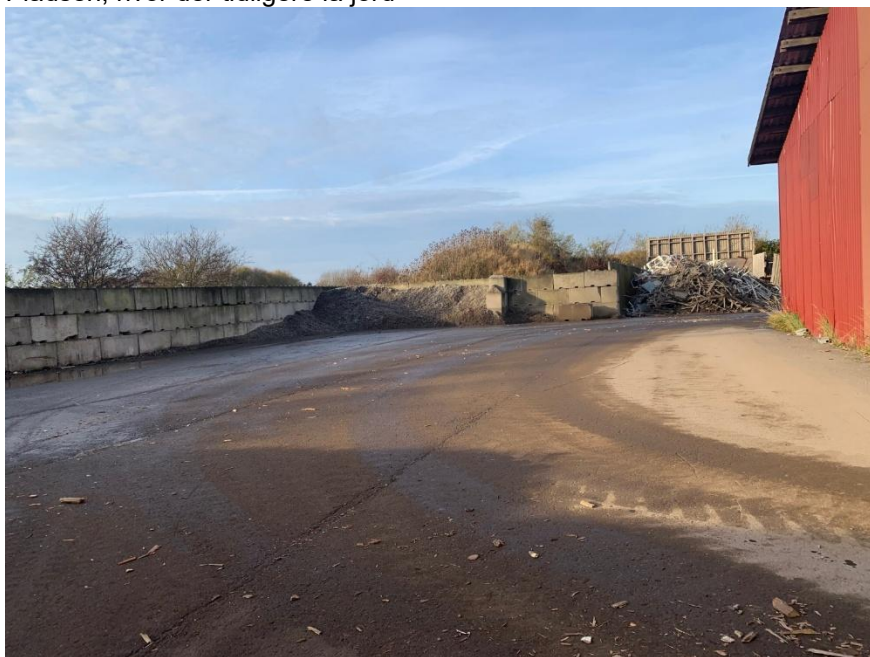

Vinduestræ for enden



Fliset træ i hallen, hvor der tidligere var MGP affald



Asfalt brokker under tag.



Vestsiden af hallen



Oplag af knust beton



Oplag og behandling af knust beton



Oplag i laden



Isolering og bagerst sveller



Vandingsmaskine



Miler på kompostpladsen





Vanddamp ved vending af miler



Specialmaskine til beluftning/vending af miler



Kørevej og belægning ved oplag af bygningstræ og beton/tegl er permeabel, dvs. ikke befæstet areal.



Isolering fra genbrugsplads (er farligt affald, hvis isoleringen er produceret inden 1997)



Isolering formentlig fra samme leverandør, for det ser meget ensartet ud.



Tank i Hallen v/kontor: Tankmærkat 3999 I, fabrikeret 2021

TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Klage tilsyn
Navn, adresse.	(RGS) Suså Landevej 75 4160 HerlufmagleHerlufmagle
CVR nr. / P-nr.	15084790
Virksomhedstype	5.3 b i Biologisk behandling større end 50 tons pr. dag
Tilsynsdato	23. oktober 2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Kompostpladsen
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Hvad gælder for virksomheden:

- Kompostpladsen er reguleret af tillæg fra 27-2 2025

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Jens Nissen samt delvis Anders Jensen. Fra Næstved Kommune Julie Lindberg.

Affald:

Opstart med modtagelse af haveaffald til kompostering er påbegyndt i maj/juni, hvor der i august og september er modtaget neddelt haveaffald fra Selinevej. Haveaffaldet var begyndt omsætning under iltfattige forhold, da vilkår fra Københavns Kommune har krævet, at det skulle ligge 14 dage før neddeling. Sortering og neddeling vil fortsat ske på Selinevej, da Vest forbrændingen fortsat vil modtage den forbrændingsegnede del. Forholdene på Selinevej er oplyst ændres fra 15 november.



Pladsen har fra slutning af september og 6 uger frem modtaget og behandlet 17.000 tons haveaffald på pladsen, hvor den har været fuldt belagt med vending mm.

På tilsynstidspunktet lå haveaffaldet i mile, som normalt bliver vendt mandag og torsdag. Desuden lå der en overdækket bunke til eftermodning.

Lugt:

På tilsyns tidspunkt torsdag kl. 11.30 var der en kraftig vind fra øst, hvor der i vindretning var en tydelig kompostlugt tæt på pladsen. Lugten var ikke sur eller kraftig, men svarende til humuslugt fra en våd skovbund. Der blev dog ikke på tilsynstidspunktet foretaget aktivitet i form af modtagelse, oplægning eller vending på kompostpladsen.

RGS erkender, at der har været opstartsproblemer med hensyn til at kunne følge med i luftning, da det neddelte haveaffald har ligget for længe inden neddeling er foregået. Derfor er omsætning begyndt under iltfattige forhold og har under oplægning og belufning givet anledning til efter virksomhedens egnede udsagn sur lugt.

Næstved Kommune oplyste, at vi evt. vil fortage endnu et tilsyn, hvis lugtklager fortsætter mht. vurdering af lugt, når der sker milevendinger samt ved mere roligere vindforhold, som nogle af naboerne har nævnt, at lugtgener har været størst.

Konklusionen på tilsynet var dog, at der ikke blev konstateret væsentligt lugt på eller udenfor matriklen.

Fotos:



Overdækket kompost til eftermodning



Lille udsnit af pladsens kompostmiler

BILAG 3:
Definition af belægninger, jf. standardvilkårsbekendtgørelsen 2079
15/11 2021 med Næstved Kommunes noter.

Belægningstype	Definition	Eksempler
Tæt belægning	En fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet, og som giver mulighed for opsamling af spild og evt. kontrolleret afledning af nedbør.	- Asfalt - Beton med epoxybehandling⁴
Fast belægning (befæstet areal)	En belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.	- Asfalt - Beton - Belægningssten eller fliser
Permeabel belægning	En vandgennemtrængelig belægning, der tillader regnvand at sive ned i jorden.	- Græsarmering - Grus- eller småstensbelægning - Fliser med brede fuger

⁴ Epoxybehandling hvis der oplagres/håndteres farlige/flydende stoffer på belægningen.

Bilag 4: Forventet krav til belægning og opsamling og håndtering af overfladevand for eksisterende godkendte affaldstyper

Type oplag udendørs	Krav til belægning	Afledning af overfladevand mm	Håndtering af vand
Havepark affald og kompost samt bioflis	Tæt belægning	Opsamling i beholder til perkolat mm	Bruges til befugtning af kompostmiler. Overskud bortskaffes til renseanlæg eller evt. udbringning på landbrugsjord.
Stød og rødder og stammer uden grønt (biobrændsel)	Fast belægning	Fald mod afløb med opsamling til beholder for pladsvand eller perkolatbeholder	Bruges til befugtning af enten byggeoplag eller kompostmiler afhængig af opsamlingsbeholder.
Oplag af jord fra ikke områdeklassificeret/ samt områdeklassificeret (prøvet taget rent)	Fast belægning	Opsamling via sandfang og evt. udskiller til beholder for andet overfladevand	Til støvbekæmpelse af jord- eller byggeaffald. Overskud bortskaffes til renseanlæg.
Inert bygningsaffald (beton/tegl/sten/glas mm)	Permeabelt underlag	Delvis nedsivning og opsamling til beholder for pladsvand	Til støvbekæmpelse af jord- eller byggeaffaldsoplag. Overskud bortskaffes til renseanlæg
Brændbart bygningsaffald (bygningstræ/"rent" vinduestræ)	Fast belægning	Fald mod afløb med opsamling til beholder for pladsvand	Til støvbekæmpelse af byggeaffald eller bortskaffelse efter analyse til renseanlæg
Daglige køreveje	Fast belægning	Fald mod afløb med opsamling af pladsvand	Til støvbekæmpelse af byggeaffald/køreveje eller bortskaffelse efter analyse til renseanlæg
Evt. Vaskeplads	Tæt belægning	Opsamling via sandfang og udskiller til beholder for pladsvand	
