



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og produktion
J.nr. 2021 - 39896
Ref. eiren/mapou/lonni
Dato: 28. juli 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Audebo Miljøcenter
Virksomhedens adresse	Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge
CVR nummer	13507406
Virksomhedstype	Hovedaktivitet: 5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t Biaktiviteter: 5.3b Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF om rensning af by spildevand: i) Biologisk behandling ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding ii) Behandling af slagger og aske. iv) Behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter. (s) K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.
Tidspunkt for tilsynet	09. juni 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn Kampagnetilsyn

Varsling af tilsynet	7. maj 2026
Deltagere fra virksomheden	Lena Hjalholt, Line Skovrider-Ruminski Johan Mortensen (delvist) Maren Sørensen COWI
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Lone Nielsen, Martin Poulsen og Irene Renta
Tilsynet omfattede	- Generel besigtigelse - rundring på deponi og anlæg for biaktiviteter, vaskeplads og værksted - Miljøstyrelsens kampagnetilsyn 2025-2026
Materiale udleveret	-



Figur 1. Audebo Miljøcenter

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
17-07-2024	Indskærpelse	Indskærpelse vedrørende dræning og udledning af grundvand Efterkommet
13-12-2024	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår vedrørende indretning og drift Efterkommet
22-09-2025	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår om kapacitet og sikkerhedsstillelse for enhed 5 og enhed 7 I proces
02-07-2026	Indskærpelse	Indskærpelse af §40 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen om håndtering af fraserteret elektrisk og elektronisk affald (EE-affald), samt vilkår 3.32 i revurderet miljøgodkendelse af 30. september 2005 om opbevaring af fraserteret farligt affald Efterkommet Audebo Miljøcenter har d. 16. juli 2026, oplyst Miljøstyrelsen at eventuelt kommende fraserteret elektronikaffald vil fremover blive opbevaret overdækket i bure, stående enten inde i værkstedsbygningen eller stående overdækket i container, der kun er åben på den ene langside. Eventuelle kommende fraserterede trykflasker og brandslukkere vil blive opbevaret i aflåst minicontainer med fast bund uden afløb.
02-07-2026	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår E1 i miljøgodkendelse af 9. september 2025, samt vilkår 3.14 og vilkår 3.25 i revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005, om forebyggelse af papir og plastflugt og opsamling af affald. Meddelt
02-07-2026	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår D1 og vilkår G1 i miljøgodkendelse af 9. september 2025, om afløb og belægning. Meddelt
02-07-2026	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår 13.3 om indretning samt vilkår 2.7 og vilkår 2.8 om hegn i revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005. Meddelt
02-07-2026	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår 13.3 i Revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005, om straks indberetning ifm. akut forurening. Meddelt

02-07-2026	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår 6.1 om perkolat opsamling, i revurderet miljøgodkendelse af 30. september 2005. Meddelt
------------	--------------	--

Indberetninger om egenkontrol

Audebo Miljøcenter indsendte d. 01. maj 2026 årsrapport samt nedsivningsregninger for 2025. Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og behandles særskilt.

Jordforurening

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening. Fremgår af nedenstående notat.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurderet miljøgodkendelse af 30. september 2005, for Audebo Affaldsdeponi
- Holbæk kommunes afgørelse af 29. maj 2008 om ikke godkendelsespligt for etablering af 2 nye celler
- Påbud af 29. juni 2012 om ændring af positivliste for affald der modtages på Audebo affaldsdeponi
- Accept af 15. marts 2013 om optagelse af restprodukt, bioaske fra Hvidebæk Fjernvarme, på Audebo Deponi positivliste (celle for blandet affald)
- Afgørelse af 23. april 2013 om revurdering af monitoringsprogram for Audebo Affaldsdeponi
- Påbud af 13. september 2013 om ændring af positivliste for affald der modtages på Audebo Affaldsdeponi
- Miljøgodkendelse af 14. januar 2014: Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden på Audebo Affaldsdeponi
- Afgørelse af 15. december 2014 om ændring af positivliste ved tilføjelse af ny affaldstype til positivlisten for Audebo Affaldsdeponi
- Påbud om vilkår om kapacitet og sikkerhedsstillelse for enhed 5 og enhed 7, 12. februar 2018
- Miljøgodkendelse af 17. august 2018 om udvidelse af enhed 7 med celle 7b
- Påbud af 7. august 2023 om supplerende vilkår for egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med perkolat og grundvand
- Påbud af 23. juli 2025 om vilkårsændring vedr. DGU-boring nr. 198.538
- Miljøgodkendelse af 9. september 2025 om flytning af affaldspladser
- Miljøgodkendelse af 19. januar 2026 om etablering af deponeringsenhed 3 til mineralsk affald
- Miljøgodkendelse af 02. juni 2026 om omlasteanlæg til madaffald

Gennemgang af miljøforhold

Indretning og drift

Affaldshåndteringsplads

På Audebo miljøcenters affaldshåndteringsplads foregår følgende aktiviteter:

1. Neddeling og oplag af brandbart affald
2. Sortering af affald, som indeholder andet end deponeringseget affald
3. Omlastning af jern og metal samt glasemballage
4. Omlastning af madaffald

Virksomheden har procedurer ift. modtagelse og sortering. Der gennemføres visuel kontrol med kamera ved indkørsel og ved aflæsning, hvor maskinføreren ser aflæsningen og udsorterer forkert sorterede emner. Typisk er den første kontrol, efter der er aflæsset, da affaldet er afdækket.

Proceduren er, at der indvejes efter vægt, deklaration fremvises (af affald til deponi), alle fraktioner tjekkes, herunder brandbart og jern. Maskinfører kører gummiged og lejlighedsvis kompaktor.

Hvis der er fejl i et læs afvises læsset. Dette er dog ikke sket endnu.

Affald kan også henvises til sorterplads.

Affald der ikke må modtages, udsorteres i bur og fraføres anlægget. Ved tilsynet var der tre bure med trykflasker, et med brandslukkere samt fire bure med elektronikaffald.

Miljøstyrelsen gjorde virksomheden opmærksom på, at elektronik- og farligt affald, skal opbevares overdækket, da det skal sikres, at det håndteres miljømæssigt forsvarligt og at farlige stoffer ikke siver ud i jorden og/eller grundvandet. Miljøstyrelsen forventer at indskærpe at §40 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen om håndtering af frasorteret elektrisk og elektronisk affald (EE-affald), samt vilkår 3.32 i revurderet miljøgodkendelse af 30. september 2005, skal overholdes.



Figur 2. Frasorteret affald i bur.

Belægningen på affaldshåndteringspladsen er sf-coloc sten. Pladsen er etableret med hældning mod afløb til pladsens nordøstlige hjørne, hvor regnvand fra pladsen ledes til.

Ved tilsynet konstaterede Miljøstyrelsen, at betonklodserne/båse, der bruges for at holde de forskellige fraktioner adskilt, forhindrer vandet at løbe mod afløbet.

Virksomheden oplyste, at der er etableret dræn under belægningen. Drænene har afløb til den lille perkolattank.

Virksomheden skal sørge for alt vand fra pladsen ikke stuver op og frit kan ledes til afløbet og perkolattanken. Miljøstyrelsen forventer at indskærpe vilkår D1 og vilkår G1 i miljøgodkendelse af 9. september 2025.



Figur 3. Afløbsforhold mellem de forskellige fraktioner, samt afløbsbrønd til opsamling af overfladevand, i pladsens nordøstlige hjørne.

Udover omlastning og sortering, foregår neddeling af forbrændingsegnet affald på pladsen. Der laves miler af det neddelte affald, som køres løbende ud til Argos affaldsforbrændingsanlæg i Roskilde.

Ved tilsynet har Miljøstyrelsen observeret en del sorte plastik sække i milen med neddelt affald. Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på, at der må ikke modtages affald i sorte poser der forhindrer visuel kontrol og rigtig sortering/håndtering af affald.

Virksomheden oplyste efterfølgende, at der er tale om plastikemballage fra kartoffelcentralen.



Figur 4. Mile af neddelt affald, sorte plastik sække på venstre side.

Virksomheden har en procedure der sikrer, at der først fraføres affald der har ligget længst, så det sikres, at affaldet bevarer sin brændværdi og ikke undergår nedbrydning.

Der har ikke været oplagret så store mængder, at det udløste krav om balletering af affaldet. Det var tidligere aftalt, at Audebo skulle sende Miljøstyrelsen ugentlige lageropgørelser på hhv. dagrenovation til omlastning og forbrændingseget affald til videre behandling (neddeling og omlastning).

Det blev ved tilsynet aftalt, at dette stopper nu, da der ikke har været behov for balletering i mange år. Fremover skal Audebo Miljøcenter kun orientere Miljøstyrelsen, når omlastning af disse fraktioner er ved at nå de godkendte mængder.



Figur 5. Neddelere og ekstra container til madaffald.

Ved rundring på anlægget har Miljøstyrelsen observeret store mængde flyvende affald. Miljøstyrelsen forventer at indskærpe, at vilkår om opsamling af affald i miljøgodkendelsen af 9. september 2025 og i revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005, ikke er overholdt. Se mere under "affald".

Affaldshåndteringspladsens østlige side grænser op mod en intern kanal. Pladsen som ses på figurer 6 og 7 er delvist afskærmet med "betonklodser", men en stor del af pladsen mod den interne kanal står "åben".



Figur 6. Pladsens østlige side, affald langs kanten af pladsen, manglende hegn.




Figur 7. Pladsens østlige side. Affald udenfor pladsen, manglende hegn. Placering af intern kanal markeret med blå.

Virksomheden oplyste, at det er planlagt etablering af hegn rundt om pladsen. Miljøstyrelsen forventer at indskærpe vilkår 13.3 om indretning samt vilkår 2.7 og vilkår 2.8 om hegn i revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005.



Figur 8. Pladsens østlige side. Affald udenfor pladsen, manglende hegn, afstand fra mile med neddelt affald.

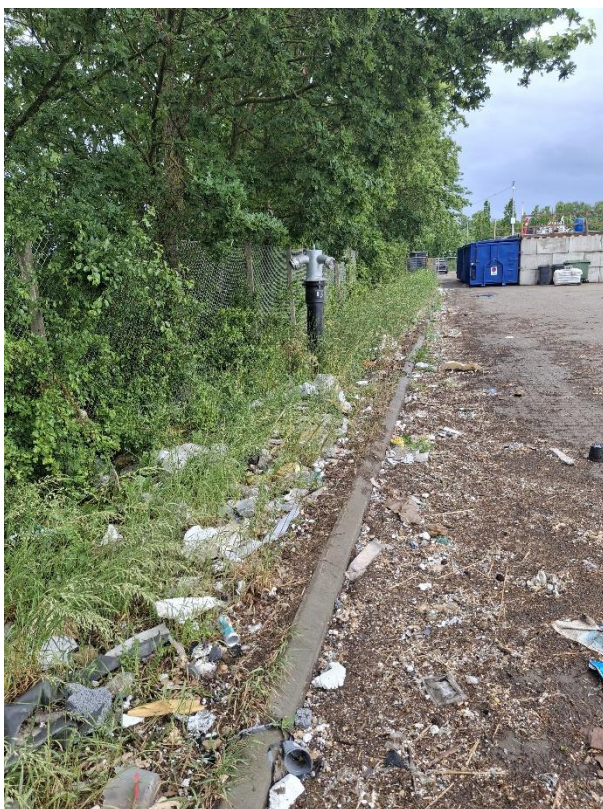

Figur 8. Der blev også observeret affald på pladsens vestlige side.

Jern og metal plads

Belægningen på jern og metal pladsen er tæt med armeret beton.
Vandet fra pladsen ledes gennem riste til en olieudskiller og videre til perkolattank.



Figur 9. Jern og metalpladsen (belægning, afløb og placering af olieudskilleren).

Omlastning af madaffald

Omlasteplads til madaffald ser pæn ud. Der er etableret en betonrampe, som komprimator-/skraldebilerne bakker op af, således at madaffaldet kan aflæsses direkte til nedsænket container.

På pladsen var der to lukkede containere til madaffald og en tredje container der sættes under rampen, når de to containere bortkøres, en gang dagligt.
Der var ikke synligt spild af madaffald eller lugtgener.





Figur 10. Omlasteanlæg til madaffald (rampen, containere, belægningen).

Vaskeplads og værksted

Vaskepladsen og værkstedet blev besigtiget. Belægningen på vaskepladsen er sf-sten med opsamling af vand via olieudskiller. Belægningen var i fin stand.

Virksomheden oplyste, at olieudskilleren er tilmeldte tømningsordning.

Sandfang tømmes samtidig med olieudskilleren en gang årligt. Sandfanget var tydelig belastet af/fyldt op med jord/grus og af hensyn til olie- og benzinudskillerens funktion, opfordrede MST til at sandfang tømmes oftere.



Figur 11. Sandfang i vaskepladsen udenfor værksted.



Figur 12. Vaskepladsen uden for værkstedet, belægning.

På værkstedet var der opsugningsmateriale tilgængelig, men også tegn på olieforurening på belægningen, der ikke var blevet oprenset. Miljøstyrelsen opfordrede virksomheden til at opbevare olie og kemikalier på spildbakke og til at bruge opsugningsmateriale og rense op efter spild på belægningen.



Figur 13. Opsugningsmateriale, ikke oprenset oliespild til belægningen.

Kompostoplag

Der lå et ca. 1500 m³ stort kompostoplag, på den befæstede del af den tidligere haveaffaldsplads mod vest.

Pladsen er opbygget med dræn, og opsamlet vand pumpes til perkolattanken og videre til Holbæk renseanlæg.



Figur 14. Kompostoplag

Virksomheden oplyste, at kompostoplaget er "rester" fra kompost dag, der blev afholdt d. 28. marts 2026 på Audebo Miljøcenter.

Kompost kommer fra Solum A/S i Roskilde og borgene kan én gang om året hente gratis kompost på Audebo Miljøcenter. Virksomheden oplyste, at de ville bede Solum om at afhente det resterende kompostoplag. Miljøstyrelsen ønsker at få billede dokumentation for, at kompostoplag er flyttet fra pladsen.

Den 13. juli 2026 oplyste Audebo Miljøcenter, at resterende kompost fjernes – senest medio august.

Jordhåndtering

På den ubefæstede del af den tidligere haveaffaldsplads, er der midlertidigt placeret jordbunker med overskuds jord/grus fra den kommende enhed 3, jf. virksomhedens jordhåndteringsplan.



Figur 15. Kartering af opgravede jordpartier fra etablering af enhed 3, tydeligt afgrænset og mærket.

Uforurenet jord eller kategori 2 jord kan anvendes til slutaftdækningen (0,5 m nederst) i enhed 5 og 7, i overensstemmelse med Tabel 3. Kategorisering af forureningskomponenter i gældende Jordflytningsbekendtgørelse.

Jord der ikke opfylder krav til slutaftdækning, skal hurtigst muligt bortskaffes til godkendt modtager.

Audebo Miljøcenter oplyste d. 13. juli 2026, at karterede jordbunker fjernes løbende, når analyser foreligger.

På pladsen var der også et midlertidigt oplag af asfalt stykker fra det areal, hvor enhed 3 skal etableres, sf-sten fra udskiftning af belægningen til den nye jern og metal plads, samt tomme affaldsbeholder og containere fra genbrugspladsen. Virksomheden oplyste, at asfalt stykker skal hurtigst muligt, bortskaffes hos godkendt modtager. Oplag af sf-sten opbevares midlertidig og skal bruges til fremtidige projekter på anlægget.

Miljøstyrelsen ønsker at blive orienteret, når asfalt er bortkørt fra deponiet.

Audebo Miljøcenter har den 13. juli 2026 fremsendt billede dokumentation for at asfalt er bortkørt fra deponiet.



Figur 16. Asfalt stykker og affalds beholde, i den i den tidligere haveaffaldsplads



Figur 17. Midlertidigt oplag af containere fra genbrugspladsen.

Produkt til mellemafdækning af asbestholdigt affald

I den sydøstlige del af den tidligere haveaffaldsplads, (nord for enhed 7b), er der oplag af mellem afdækningsprodukt. Virksomheden oplyste at produktet hedder "Genbrugs ballast" og som sædvanlig bliver købt hos Blue Phoenix Denmark (tidligere RGS Nordic). Ballast indeholder neddelt byggeaffald herunder tegl og beton. Pris er mellem 5 og 25 kr./ton. Der foreligger analyser af materiale hos leverandør.

Det er aftalt, at virksomheden fremsender Miljøstyrelsen produktets Miljøvaredeklaration. Deklaration blev modtaget d. 13. juli 2026. Miljøstyrelsen tager den til efterretning.



Figur 18. Oplag af ballast til daglig afdækning af asbestholdigt affald.

Hallen

Der aflæsses 4 fraktioner i miljøcenterets omlastehal. Pap, papir, plast og restaffald fra husholdninger. De sorterede fraktioner bliver fraført løbende.

Ved tilsynet blev drøftet en mere effektiv løsning ift. aflukning af hallen for at kunne holde måger og andre dyr ude. Miljøstyrelsen bad om at net og anden sikring bliver repareret, så det er funktionelt, i overensstemmelse med vilkår 3.23 i revurdering af miljøgodkendelse for Audebo Miljøcenter af 30. september 2005.

Audebo Miljøcenter oplyste d. 13. juli 2026, at net i omlastehallen er hele. Billede dokumentation er modtaget.



Figur 19. Omlastning af pap og papir i hallen.

Etablering af enhed 3

Det blev aftalt, at hvis der forekommer væsentlige ændringer i forhold til projektbeskrivelsen, skal Miljøstyrelsen orienteres og ændringerne begrundes.

Virksomheden oplyste, at ifm. fritlæggelse af olieudskilleren fra den tidligere jern og metal plads (i den kommende enhed 3), blev der påvist jordforurening med kulbrinter. Miljøstyrelsen gjorde igen opmærksom på, at fund af forurening straks skal indberettes til tilsynsmyndigheden.

Ved tilsynet sås tydelig perkolat påvirkning af opgravet rørledning ifm. opbrydning og optagning af belægninger og brønde samt ledninger på den tidligere affaldshåndteringsplads på arealet for den kommende enhed 3.

Miljøstyrelsen kunne ikke vurdere årsagen til perkolat opstuvning i udgravningerne, men mener ikke, at al perkolat fra enhederne 1 og 4 opsamles i perkolattanken. Miljøstyrelsen forventer at indskærpe, at perkolat fra hver deponeringsenhed skal føres i gravitationsledninger frem til perkolat-samletank via pumpebrønde i henhold til vilkår 6.1 i revurderet miljøgodkendelse af 30. september 2005. Se mere under "uheld".

Den 16. juli 2026 oplyste Audebo Miljøcenter følgende til Miljøstyrelsen:

Det er regnvandsfortyndet perkolat fra "uheldet" i hjørnet ved enhed 1 og 4.

Der har langs enhed 1 været en grøft til opsamling af overfladevand fra den tidligere plads til neddeling af brændbart affald (kommende enhed 3).

Der var fra grøften langs enhed 1 et rørlagt afløb videre til grøften, som er vist på billederne.

Ved start af "uheldet" med udstrømmende perkolat fra "perkولاتomme" i skråningen i hjørnet af enhed 1 og 4 løb der således perkolat ud i grøften langs enhed 1 og via den fortsat eksisterende rørlægning videre til grøften, som ses på billederne.

Ifm. "uheldet" løb der kun en mindre mængde perkolat til den på billedet viste grøft, som efterfølgende er blevet fyldt mere op ved regnvandshændelser efter "uheldet"

Den regnvandsfortyndede perkolat i grøften er efterfølgende pumpet til perkolattank - og rørlægning samt grøft vil blive fjernet i forbindelse med det fremadskridende arbejde med etablering af enhed 3.

Miljøstyrelsen tager virksomhedens redegørelse til efterretning.



Figur 20. Perkolat i udgravning. Der ses afløb fra den tidligere affaldshåndteringsplads i den kommende enhed 3.



Figur 21. Perkolatpåvirkning i udgravning ved samlebrønd fra den tidligere affaldshåndteringsplads.

Lugt

Der har ikke været lugtklager. Ved tilsynet var det svært for Miljøstyrelsen at konkludere, hvorvidt lugten i området stammer fra Miljøcenters aktiviteter eller nabovirksomheden BioVækst.

Spildevand

Perkolat, øvrigt spildevand og overfladevand fra befæstede arealer og vaskepladser bliver ledt til perkolattank og videre til Holbæk renseanlæg.

Audebo Miljøcenter har ifm. den nye tilslutningstilladelse fra Holbæk kommune fået krav om at lave perkolat for-rensning for PFAS.

Virksomheden har indsendt en ansøgning til Miljøstyrelsen, om miljøgodkendelse til PFAS rensningsanlæg samt etablering af en ny tank til særligt belastet overfladevand.

Miljøstyrelsen er opmærksom på, at der kan være et misforhold mellem Audebo Miljøcenters fysiske areal og den bortledte spildevandsmængde.

Støj

Der har ikke været støjklager.

Affald

Ved tilsynet var der konstateret flyvende affald. Miljøstyrelsen forventer at indskærpe vilkår E1 i miljøgodkendelse af 9. september 2025, samt vilkår 3.14 og vilkår 3.25 i Revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005, om forebyggelse af papir og plastflugt og opsamling af affald.

Perkolattank

Ved rundring på anlægget oplyste virksomheden, at perkolattanken for nylig blev tæthedsprøvet uden bemærkninger.

Miljøstyrelsen vil gerne have tilsendt beholderkontrollen.

Audebo Miljøcenter fremsendte d. 13. juli 2026, rapport fra beholderkontrol udført i 2022, samt faktura for udskiftning af kabel/wire.

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse var ikke en del af tilsynet.

Driftsforstyrrelser og uheld

Den 2. juni 2026 modtog Miljøstyrelsen orientering om, at der den 27. maj 2026 skete et uheld i forbindelse med afgravning af voldkant på de gamle enheder (1 og 4). Som følge af uheldet, løb der perkolat lignende væske ud af cellerne.

Miljøstyrelsen besigtigede det perkolat påvirkede område d. 3. juni 2026.

Virksomheden oplyste, at der var løbet i omegnen af 30-45 m³ perkolat ud og at det er blevet pumpet i perkolattanken. Dette er beregnet med baggrund i driftstid på pumpe og dennes

ydelse. (umiddelbart kørte pumpen kontinuerligt ved fysisk tilsyn, men pumpede ikke perkolat da renden var tom).



Figur 22. Del af det perkolat påvirkede område langs enhed 1. som sås på tilsynsdag.

Hændelsen var for lille til at kunne konstateres i overvågning af fraført perkolat fra central perkolattank.

Miljøstyrelsen forventer at indskærpe, at sådanne hændelser skal meddeles til tilsynsmyndigheden straks.

Virksomheden oplyste, at indberetningen blev forsinket, da der var fokus på at løse opgaven akut. Hvilket efter Miljøstyrelsens vurdering ikke forhindrer virksomheden i at orientere om hændelsen sideløbende med akutindsats, så der ikke går 6 dage inden orientering til MST sker.

Det er aftalt, at virksomheden undersøger dræn i dette område, da perkolat burde være afdrænet og ikke burde kunne træde ud af enhedens side. Dette er bestilt og bliver opstartet i løbet af august måned. Miljøstyrelsen forventer at få fremsendt undersøgelsen, når den foreligger.

I forbindelse med etablering af enhed 3 kunne det konstateres, at fritlagt membran er overskredet af tidligere etablerede celler 4 og 1. Dette kan have ledt til at perkolat fra denne del af enhederne ikke er opsamlet i dræssystem, men er løbet ud over membran og har givet anledning til jordforurening.

Miljøstyrelsen forventer at indskærpe vilkår 6.1 i revurdering af miljøgodkendelse for Audebo Miljøcenter af 30. september 2005.



Figur 23. Etablerede enheder er skredet og overskrider barrierer, her deponeringsenhed 4.



Figur 24. Der sås tydeligt affald fra udskredne dele af enhed 4, som overskrider det afdrænedes område for enheden.



Figur 25. Der sås udtrædende perkolat fra de dele af enheder 1 og 4 som var skredet ud over membranlagt areal.



Figur 26. Perkolat ses i udskredet del af celle 1, som ligger over membranvold.

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at affald fra de gamle enheder ikke må give anledning til perkolatpåvirkning af enhed 3, jf. vilkår B15 i miljøgodkendelse af enhed 3 af 19. januar 2026. *"Der skal være hydraulisk adskillelse mellem enhed 3 og alle andre enheder (1, 4, 5 og 7)."*

Deponering af affald i V'et

Argo har i maj 2026 fremsendt spørgsmål til sikkerhedsstillelse til Miljøstyrelsen, idet dette spørgsmål på tidspunktet for tilsynet ikke er besvaret, er der ikke givet accept til at V'et mellem enhederne 5 og 7 kan opfyldes.

Miljøstyrelsen kunne konstatere at der var en tydelig opfyldning af V mellem enhederne 7a og 5.



Figur 27. V'et, deponering af mineralsk affald mellem enhederne 5 (blandet affald) og enhed 7 (mineralsk affald).



Figur 28. Affald opfyldt i V'et mellem enhederne 5 og 7. I baggrunden ses signalnet udlagt på enhed 5.

Virksomhed BioVækst

På tilsynet blev der konstateret at BIO VÆKST, som lejer sig ind på Argos areal, udledte synligt belastet vand til en form for omfangskanal omkring komposteringsbunkerne på virksomheden.

Idet der ikke kunne ses nogen synlig afgrænsning af omfangskanalen, kan der forekomme tilledning af næringsbelastet vand til omgivende jord og Argos omfangskanal.

Disse iagttagelser meddeles Holbæk kommune som er miljømyndighed for virksomheden, men er medtaget i tilsynsrapporten, da aktiviteten kan have påvirket Argos drift i form af jordforurening og belastning af omgivelserne herunder omfangskanal.



Figur 29. Der blev pumpet overfladevand fra virksomheden BIOVÆKST i en intern kanal som omkranser virksomhedens oplag af komposterbart materiale.



Figur 30. Kanal omkranser virksomheds BioVækst aktiviteter og stopper ved Miljøcenters omfangskanal.

Det var ikke muligt, at vurdere om virksomhedens omfangskanal kan påvirke deponiets omfangskanal. Dog vurderer Miljøstyrelsen, at BioVæksts aktiviteter, kan have påvirket arealet udenfor virksomhedens driftsområde, dette skal undersøges.

Den 16. juli 2026 oplyste Audebo Miljøcenter til Miljøstyrelsen, at der er ingen forbindelse mellem "grøften" rundt om Biovækst og omfangskanalen rundt om Audebo Miljøcenter.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende håndhævelser:

1. Indskærpelse af §40 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen om håndtering af frasorteret elektrisk og elektronisk affald (EE-affald), samt vilkår 3.32 om opbevaring af frasorteret farligt affald, i revurderet miljøgodkendelse af 30. september 2005.
2. Indskærpelse af vilkår E1 i miljøgodkendelse af 9. september 2005, samt vilkår 3.14 og vilkår 3.25 i revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005, om forebyggelse af papir og plastflugt og opsamling af affald.
3. Indskærpelse af vilkår D1 og vilkår G1 i miljøgodkendelse af 9. september 2005, om afløb og belægning.
4. Indskærpelse af vilkår 13.3 om indretning samt vilkår 2.7 og vilkår 2.8 om hegn i revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005.
5. Indskærpelse af vilkår 13.3 i Revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005, om straks indberetning ifm. akut forurening.
6. Indskærpelse af vilkår 6.1 om perkolat opsamling, i revurderet miljøgodkendelse af 30. september 2005.

På tilsynet aftaltes, følgende:

- Der sendes ikke mere ugentlige lageropgørelser på hhv. dagrenovation til omlastning og forbrændingseget affald til Miljøstyrelsen. Fremover skal Miljøstyrelsen kun orienteres, når omlastning af disse fraktioner er ved at nå de godkendte mængder.
- Miljøvaredeklaration for "Genbrugs ballast", produkt til mellemafdækning af asbestholdigt affald. **Modtaget** d. 13. juli 2026.
- Virksomheden fremsender til Miljøstyrelsen billede dokumentation for at net og anden sikring bliver repareret, så det er funktionelt. **Modtaget** d. 13. juli 2026.
- Hvis der forekommer væsentlige ændringer i forholdt til projektbeskrivelsen skal Miljøstyrelsen orienteres og ændringerne begrundes.
- Virksomheden undersøger dræn i det perkolat påvirket område pga. uheldet og fremsender undersøgelsen til Miljøstyrelsen, når den foreligger. **I proces.**
- Virksomheden fremsender beholderkontrollen for perkolattanken til Miljøstyrelsen. **Modtaget** d. 13. juli 2026.
- Virksomheden orienterer Miljøstyrelsen, når asfaltstykker er bortkørt fra deponiet. **Modtaget** d. 13. juli 2026.
- Virksomheden fremsender billede dokumentation for at kompostoplag er flyttet fra pladsen til Miljøstyrelsen. **I proces.**
- Jorden der ikke opfylder krav til slutaftdekning, skal hurtigst muligt bortskaffes hos godkendt modtager. **I proces.**

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.
