Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion
J.nr. 2024 - 32349
Ref. lonni/mapou
Dato: 12.11.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Fredtofte Losseplads
Virksomhedens adresse	Fredtoftevej 7, 2980 Kokkedal
CVR-nummer	29188335
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	Den 16. september 2026
Baggrunden for tilsynet	Basis tilsyn, Kampagnetilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet er varslet den 26. august 2026
Deltagere fra virksomheden	Afbud fra Lennart Staarup, Fredensborg Kommune
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Lone Nielsen og Martin Poulsen
Tilsynet omfattede	Formålet med tilsynet er • Opfølgning på status for måling af drænvand der afledes til Donse å. • PFAS analyser 2026 (ingen analyser i 2025) • Udpumpning af perkolat i 2025
Materiale udleveret	

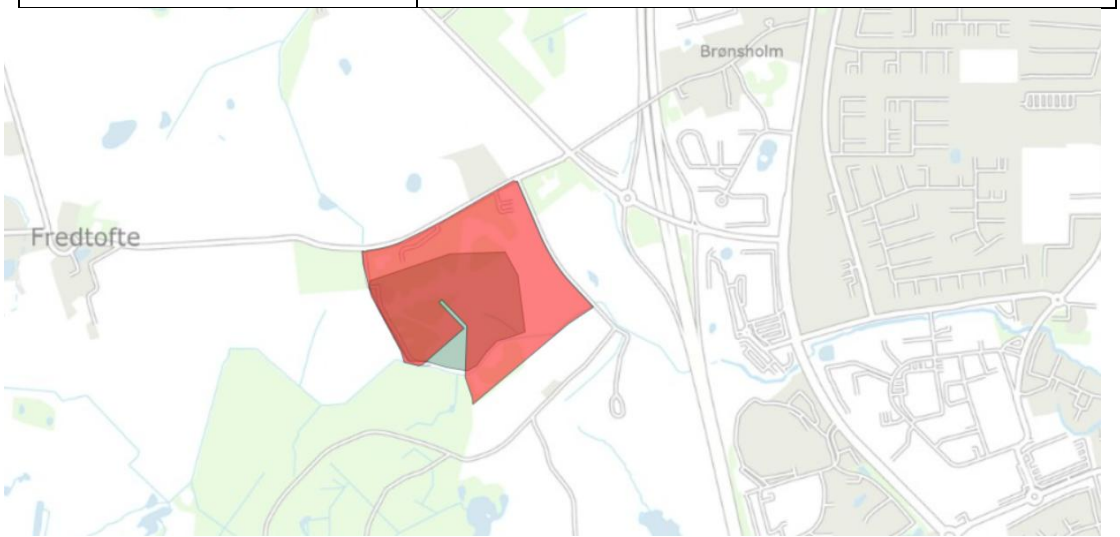

Kortet viser Fredtofte Losseplads, beliggende vest for Kokkedal i Fredensborg Kommune.

Opfølgende møde mellem Fredensborg Kommune og Miljøstyrelsen.

På baggrund af fremsendt udkast til tilsynsrapport har Fredensborg Kommune udbedt sig et møde, som blev afholdt den 28/10 2026.

Til stede var Lennart Staarup og Dorte Tirsgaard begge Fredensborg Kommune, Lone Nielsen og Martin Poulsen Miljøstyrelsen.

Fredensborg Kommune anførte på mødet, at det ville have været bedre, at de havde været til stede ved tilsynet. Miljøstyrelsen har vurderet, at tilsynet kunne gennemføres ved en fysisk gennemgang med efterfølgende opklarende spørgsmål.

Det blev ligeledes anført af Fredensborg Kommune, at anlægget er gammelt og har ligget der i mere end 25 år. Fredensborg Kommune stillede spørgsmål ved det rimelige i at begynde at håndhæve Miljøstyrelsens påbud af 14. maj 2019.

Miljøstyrelsen tydeliggjorde, at påbuddet er gældende og pointerede vigtigheden i at:

- Perkolatopsamlingssystem er funktionelt
- At der foreligger tilgængeligt materiale omkring perkolatopsamlingssystemets opbygning
- At påbudte vilkår herunder analyser gennemføres
- At indhold og mængder af perkolat er kendte og giver Miljøstyrelsen et grundlag for at træffe afgørelser.

Miljøstyrelsen oplyste, at der ved tilsynet er lagt vægt på at følgende påbudte vilkår overholdes:

Perkolat - Med de angivne vilkår om perkolatafledning er det Miljøstyrelsen hensigt at understrege, at overvågning og vedligehold af perkolatafledningen på Fredtofte Losseplads er af den største vigtighed:

Vilkår 5:
Perkolat fra Fredtofte Losseplads skal ledes via Fredensborg Forsynings spildevandsledning til Usserød Renseanlæg i Hørsholm Kommune.

Vilkår 6:
Der skal årligt foretages en opgørelse af den mængde perkolat, der er afledt til offentligt spildevandsanlæg.

Vilkår 7:
Perkolatpumpebrønden skal overvåges elektronisk, og der skal være etableret alarm, som giver besked i tilfælde af pumpestop, der kan føre til opstuvning i perkolatsystemet.

Vilkår 11:
Perkolatsystemerne på deponeringsenhederne skal løbende efterses og renses i nødvendigt omfang.
Eventuelle skader på perkolatsystemerne og pumper skal indberettes til Miljøstyrelsen og straks udbedres.

Udledning dræn Øst
Vilkår 20:
Fredensborg Kommune skal senest med årsrapport for 2019 fremsende

koordinater for udledningspunktet i Donse Å til Miljøstyrelsen.
Der skal årligt foretages en opgørelse af den mængde drænvand, der er afledt til Donse Å.

Vilkår 21:
Drænvandet skal moniteres 2 gange årligt efter to analyseprogrammer – et rutineprogram og et udvidet program.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med behandling af årsrapport for Fredtofte Losseplads.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser

- Påbud af den 14. maj 2019 om monitering og afværge på Fredtofte Losseplads
- Påbud af den 6. juni 2023 om ændret egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol af perkolat og grundvand

Gennemgang af miljøforhold

Fredensborg Kommunes kontaktperson havde meldt afbud inden tilsynet. Tilsynet bestod derfor af Miljøstyrelsens rundering på deponiet uden kommunens repræsentant.

Status for måling af udledning af drænvand til Donse å

Ved runderingen på deponiet, var der fokus på tilledninger til Donse å. Se fotos.



2) Udsivning af okker(?) til Donse år (nordvendt brink i det sydvestlige hjørne af Fredtofte deponi)



3) Udledning fra Drænbrønd Øst til Donse å.



4) Billedet er taget ind i udløbsrøret.

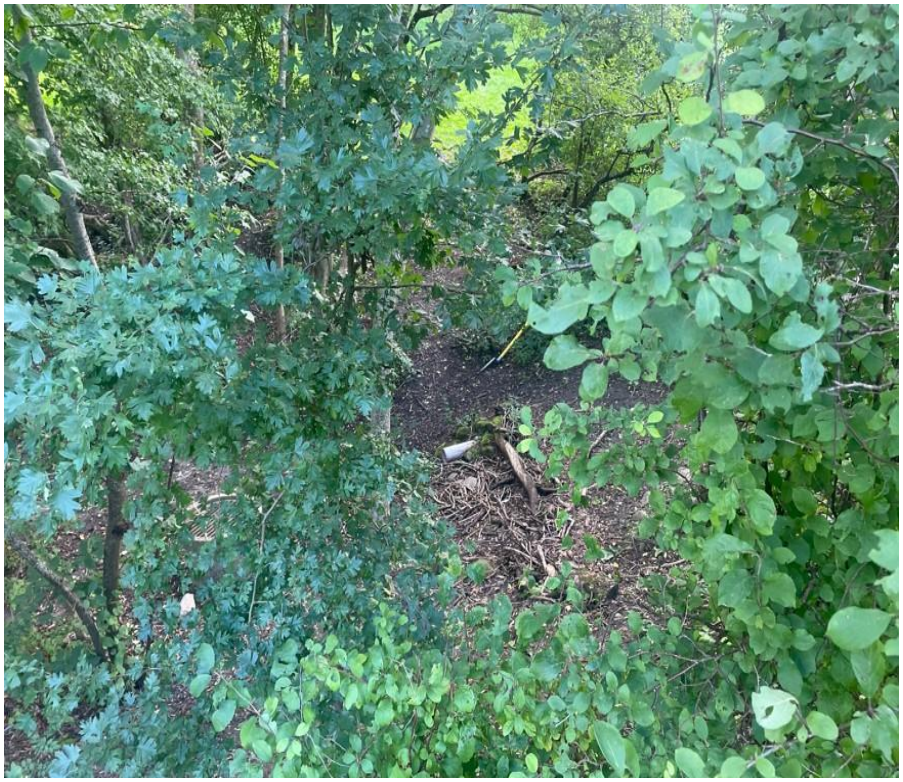

5) Gammelt fritlagt drænrør i det gamle åløb for Donse å.

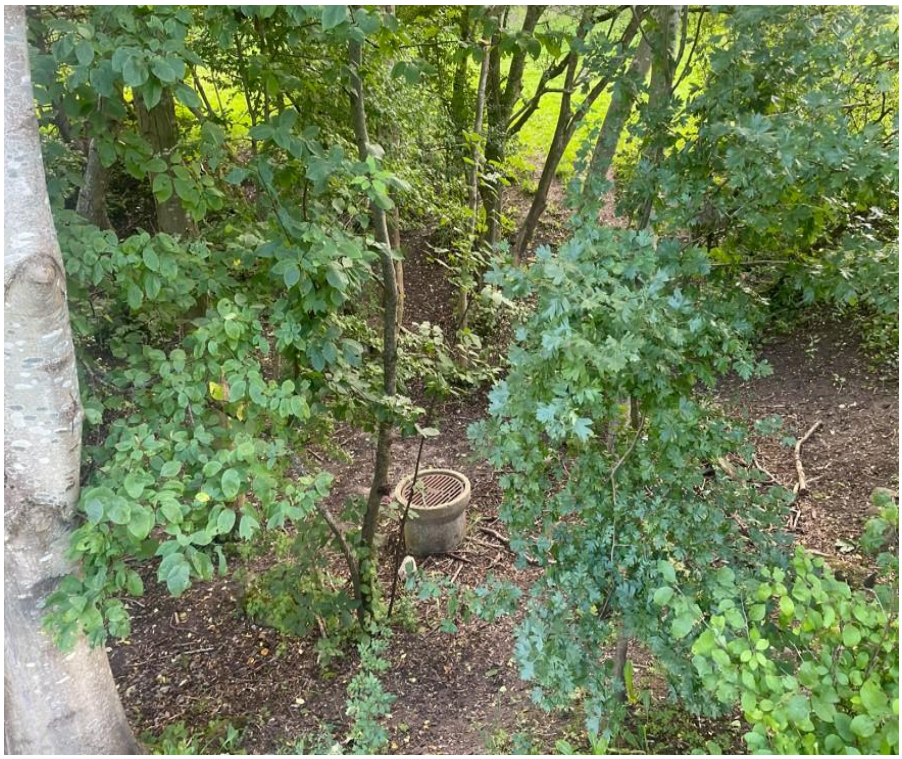
6) Drænbrønd samme sted i det gamle åløb for Donse å.

Af Miljøstyrelsens påbud af 14. maj 2019 vilkår 20 fremgår det, at der årligt skal foretages en opgørelse af den mængde drænvand, der afledes til Donse å.

I årsrapport 2025 for Fredtofte Losseplads, oplyser Fredensborg Kommune, at det siden 2021 er forsøgt at måle flowet af udledning af drænvand til Donse å. I 2023 måtte kommunen konkludere, at det installerede system til måling af flow til Donse å fra Dræn øst ikke virkede optimalt.

Kommunen har undersøgt alternative metoder til flowmåling, men oplyser, at kun en bekostelig ombygning af brønden inden udløb, ser ud til at være en løsning.

Kommunen har siden 2024 haft fokus på, at forsøge at undersøge det vand der udledes til åen, og har derfor truffet aftale med et analyselaboratorie om at udtage en prøve en dag ved kraftig nedbør og udløb til åen. Det oplyses i årsrapporten, at det ikke har været muligt trods forsøg i 2024 og 2025.

Vilkår om overvågning af udledt mængde og indhold, vilkår 20 og 21 i påbud af 14. maj 2029 vil blive indskærpet i forbindelse med behandling af årsrapporten.

PFAS analyser 2025

Det fremgår af påbud meddelt af Miljøstyrelsen den 6. juni 2023, at der skal tilføjes PFAS-forbindelser til den egenkontrol Fredensborg Kommune foretager i perkolat og grundvand tilknyttet Fredtofte Losseplads.
Af årsrapporten for Fredtofte Losseplads fremgår det, at der ikke er udført analyser for PFAS i 2025 på grund af en forglemmelse hos analyselaboratoriet.
Vilkår om egenkontrol for PFAS vil blive indskærpet i forbindelse med behandling af årsrapporten

Udpumpning af perkolat

I 2025 blev der registreret den laveste mængde udpumpede perkolat siden måleperiodens registrering med start i 2010. I forhold til mængden i 2024 er der i 2025 en reduktion i den udpumpede mængde på ca. 75%. Reduktionen vurderes ikke alene at kunne tilskrives, at 2025 var et relativt tørt år. Fokus bør rettes mod vedligeholdelse af dræn og rørledninger på deponiet.
Det er ikke oplyst, hvornår der senest har været kontrol og vedligeholdelse (spuling) af dræn og rørledninger på Fredtofte Losseplads.

Af Miljøstyrelsens påbud af 14. maj 2019 vilkår 11 fremgår det, at perkolatsystemerne på deponeringsenhederne løbende skal efterses og renses i nødvendigt omfang.

Kommunen skal jf. påbuddet sikre, at dræn og rørledninger vedligeholdes og opsamling af perkolat er funktionelle.

Redegørelse for den faldende perkolatproduktion vil blive behandlet særskilt i Miljøstyrelsens gennemgang af årsrapport.

Udsivning af okkerfarvet substans

Af foto 2) ses udsivning af rød okker/perkolat eller lignende i brinken til Donse å. Miljøstyrelsen har ved tidligere tilsyn opfordret kommunen til at overveje, at undersøge om okkerfarvningen kan skyldes, at der sker en forurening af vandet med ud sivende perkolat fra siden af lossepladsen, hvilket kan ske som følge af kompakte lag i deponiet.

Da udsivningen kan have sammenhæng med manglende kontrol og vedligeholdelse af dræn og rørledninger, vil Miljøstyrelsen vende tilbage i sagen.

Spildevand

Perkolat fra Fredtofte Losseplads ledes via Fredensborg Forsynings spildevandsledning til Usserød Renseanlæg i Hørsholm Kommune.

Kampagnetilsyn

Jordoplag
I forbindelse med tilsyn med deponier, er Miljøstyrelsen i gang med at kortlægge, om der er oplag af jord, som deponierne kan have liggende til eventuel slutafdækning.

Miljøstyrelsen observerede ikke jordoplag på Fredtofte Losseplads.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Opgørelse af den mængde drænvand, der afledes til Donse å foreligger endnu ikke. Miljøstyrelsen bemærker, at det er et vilkår i Miljøstyrelsens påbud af 14. maj 2019 og forventer at indskærpe forholdet i forbindelse med behandling af årsrapporten for 2025.

- PFAS- analyser foreligger ikke for 2025. Miljøstyrelsen bemærker, at det af Påbud om ændret egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med perkolat og

grundvand meddelt 6. juni 2023, fremgår krav om analyse for 22 PFAS-forbindelser som del af det udvidede analyseprogram for perkolat. Miljøstyrelsen indskærper forholdet i forbindelse med behandling af årsrapporten for 2025.

- Vedrørende udpumpede perkolat mængder. Fredensborg kommune anmodes om at fremsende redegørelse for fald i perkolatproduktion.

- Kommunens aftale med en smed-/VVS-montør om vedligehold af pumper, evt. suppleret med dokumentation i form af kvitteringer, hvis dette belyser metode og kadence

- Kommunens aftale med kloakmester/slamsugerfirma om rensning/spuling af dræn, herunder hvordan dræn renses/spules og hvornår det skal ske, evt. suppleret med dokumentation i form af kvitteringer, hvis det belyser metode og kadence.

- Vedrørende vilkår 11 om vedligehold af perkolatsystem, anmodes Fredensborg Kommune om at fremsende plan for eftersyn og eventuelt vedligehold af perkolatopsamlingssystemet i sin helhed.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.
