Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og produktion
J.nr. 2021 - 39896
Ref. eiren/mapou
Dato: 23. november 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Audebo Miljøcenter
Virksomhedens adresse	Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge
CVR nummer	13507406
Virksomhedstype	Hovedaktivitet: 5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t Biaktiviteter: 5.3b Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF om rensning af by spildevand: i) Biologisk behandling **ii) Forbehandling af affald med henblik på for brænding eller medforbrænding** ii) Behandling af slagger og aske. iv) Behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter. (s) K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Tidspunkt for tilsynet	14. september 2026
Baggrunden for tilsynet	Opfølgning på håndhævelser, §9 tilsyn[1]

[1] J.f. Miljøtilsynsbekendtgørelsen, BEK nr. 1536 af 09/12/2019

Varsling af tilsynet	-
Deltagere fra virksomheden	Johan Mortensen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Martin Poulsen og Irene Renta
Tilsynet omfattede	Opfølgning af håndhævelser af 2. juli 2026
Materiale udleveret	-



Figur 1. Audebo Miljøcenter

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
22-09-2025	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår om kapacitet og sikkerhedsstillelse for enhed 5 og enhed 7 **I proces**
02-07-2026	Indskærpelse	Indskærpelse af §40 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen om håndtering af frasorteret elektrisk og elektronisk affald (EE-affald). **Efterkommet** Audebo Miljøcenter har d. 16. juli 2026, oplyst Miljøstyrelsen at eventuelt kommende frasorteret elektronikaffald fremover vil blive opbevaret overdækket i bure, stående enten inde i værkstedsbygningen eller stående overdækket i container, der kun er åben på den ene langside. Indskærpelse af vilkår 3.32 i revurderet miljøgodkendelse af 30. september 2005 om opbevaring af frasorteret farligt affald. **Meddelt** Audebo Miljøcenter har d. 16. juli 2026, oplyst Miljøstyrelsen, at eventuelle kommende frasorterede trykflasker og brandslukkere vil blive opbevaret i aflåst minicontainer med fast bund uden afløb. På tilsynet d. 14. september 2026, blev der konstateret et bur til brandslukker, 2 tomme bure til trykflasker samt en del trykflasker og en tom blå plastbeholder til opbevaring af nødudstyr ved kemikaliespild.
02-07-2026	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår E1 i miljøgodkendelse af 9. september 2025, samt vilkår 3.14 og vilkår 3.25 i revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005, om forebyggelse af papir og plastflugt og opsamling af affald. **Meddelt**
02-07-2026	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår D1 og vilkår G1 i miljøgodkendelse af 9. september 2025, om afløb og belægning. **Meddelt**
02-07-2026	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår 13.3 om indretning samt vilkår 2.7 og vilkår 2.8

		om hegn i revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005. **I proces**
02-07-2026	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår 13.3 i Revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005, om straks indberetning ifm. akut forurening. **Meddelt**
02-07-2026	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår 6.1 om perkolat opsamling, i revurderet miljøgodkendelse af 30. september 2005. **I proces**

Indberetninger om egenkontrol
Audebo Miljøcenter indsendte d. 01. maj 2026 årsrapport samt nedsivningsregninger for 2025. Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i forbindelse dette tilsyn og behandles særskilt.

Jordforurening
Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening. Fremgår af nedenstående notat.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurderet miljøgodkendelse af 30. september 2005, for Audebo Affaldsdeponi
- Holbæk kommunes afgørelse af 29. maj 2008 om ikke godkendelsespligt for etablering af 2 nye celler
- Påbud af 29. juni 2012 om ændring af positivliste for affald der modtages på Audebo affaldsdeponi
- Accept af 15. marts 2013 om optagelse af restprodukt, bioaske fra Hvidebæk Fjernvarme, på Audebo Deponi positivliste (celle for blandet affald)
- Afgørelse af 23. april 2013 om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi
- Påbud af 13. september 2013 om ændring af positivliste for affald der modtages på Audebo Affaldsdeponi
- Miljøgodkendelse af 14. januar 2014: Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden på Audebo Affaldsdeponi
- Afgørelse af 15. december 2014 om ændring af positivliste ved tilføjelse af ny affaldstype til positivlisten for Audebo Affaldsdeponi
- Påbud om vilkår om kapacitet og sikkerhedsstillelse for enhed 5 og enhed 7, 12. februar 2018
- Miljøgodkendelse af 17. august 2018 om udvidelse af enhed 7 med celle 7b
- Påbud af 7. august 2023 om supplerende vilkår for egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med perkolat og grundvand

- Påbud af 23. juli 2025 om vilkårsændring vedr. DGU-boring nr. 198.538


- Miljøgodkendelse af 9. september 2025 om flytning af affaldspladser
- Miljøgodkendelse af 19. januar 2026 om etablering af deponeringsenhed 3 til mineralsk affald

- Miljøgodkendelse af 02. juni 2026 om omlasteanlæg til madaffald

Gennemgang af miljøforhold

Opfølgning på indskærpelse af §40 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen om håndtering af frasorteret elektrisk og elektronisk affald (EE-affald), samt vilkår 3.32 i revurderet miljøgodkendelse af 30. september 2005 om opbevaring af frasorteret farligt affald af 2. juli 2026.

Ved tilsynet blev der observeret et uoverdækket bur med frasorteret elektronikaffald.

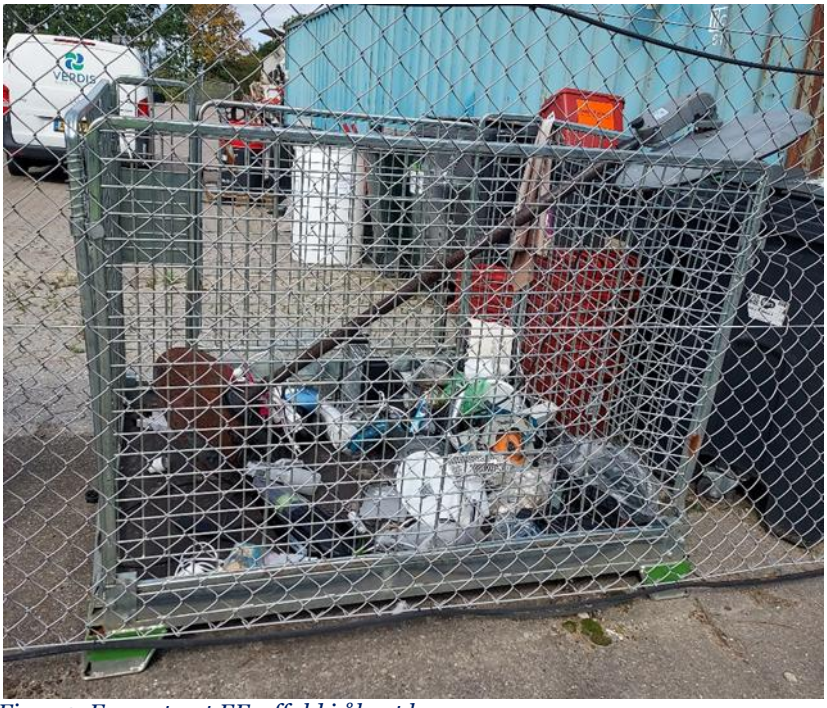

Figur 2. Frasorteret EE-affald i åbent bur.

Derudover blev der konstateret et bur til brandslukkere samt 2 tomme bure til trykflasker samt en del trykflasker og en tom blå plastbeholder til opbevaring af nødudstyr ved kemikaliespild.

Miljøstyrelsen gjorde endnu en gang virksomheden opmærksom på, at elektronik- og farligt affald, skal opbevares overdækket, da det skal sikres, at det håndteres miljømæssigt forsvarligt og at farlige stoffer ikke siver ud i jorden og/eller grundvandet.

Argo oplyste til Miljøstyrelsen d. 12. november 2026, at de fotograferede EE-affald, tilhører Verdis, som er blevet orienteret om, at det skal de opbevare overdækket.
Dét EE-affald, som Miljøstyrelsen observerede stående i udendørs bure ved tilsynet den 9. juni 2026, er blevet fjernet.

Derudover oplyser Argo, at området for ulovlig opbevaring af farligt affald, vil blive ryddet og kasserede brandslukkere samt trykflasker vil fremover blive opbevaret på overdækket område.

Miljøstyrelsen kan konstatere, at indskærpelsen af §40 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen om håndtering af frasorteret elektrisk og elektronisk affald (EE-affald) er efterkommet, men indskærpelsen af vilkår 3.32 i revurderet miljøgodkendelse af 30. september 2005, af 2. juli 2026 ikke er efterkommet, idet frasorteret farligt affald blev igen konstateret opbevaret uhensigtsmæssigt.



Figur 3. Frasorteret farligt affald.


Opfølgning på indskærpelse af vilkår D1 og vilkår G1 i miljøgodkendelse af 9. september 2025 om afledning af vand, af 2. juli 2026.


Ved tilsynet blev der igen konstateret lunker i belægningen (opstuvning af regnvand/overfladevand) i båsene til glas- og metalaffald. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at dette skyldes delvist manglende vedligeholdelse og oprensning af "afløbskanalerne" mellem betonklodserne.


Som det fremgår af tilsynsbillederne, er der ikke sket rensning/vedligeholdelse af de eksisterende afløbskanaler i betonklodserne, som følge heraf kan belastet overfladevand ikke løbe mod afløb til opsamlingstank.

Argo anerkender, at baggrunden for opstuvning af vand i båsene skyldes rigtig nok manglende rensning af afløbskanalerne i båsene og oplyser til Miljøstyrelsen at forholdet vil blive forbedret.

Dog mener Argo ikke, at der blev igen konstateret "lunker i belægningen".
Argo mener ikke, at opstuvningen på billederne skyldes lunker, men et generelt fald på pladsen, hvorved regvand på pladsen kan risikere at blive "fastholdt" i båsene ved evt. manglende rensning af afløbskanalerne i betonklodserne.

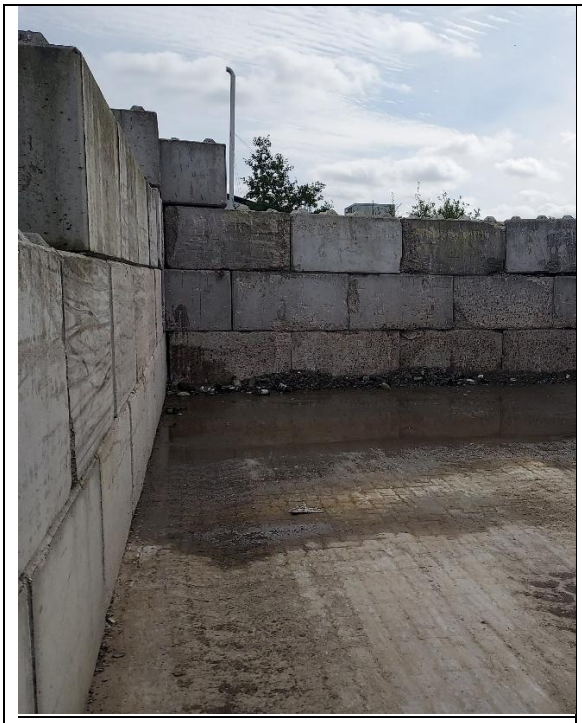

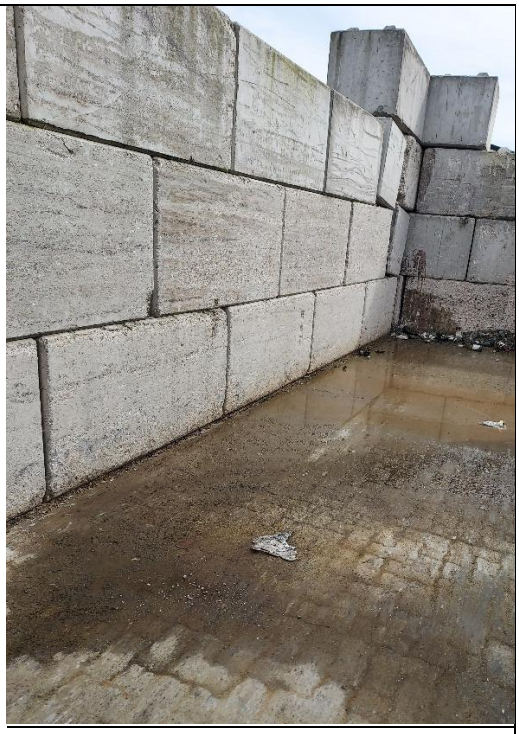

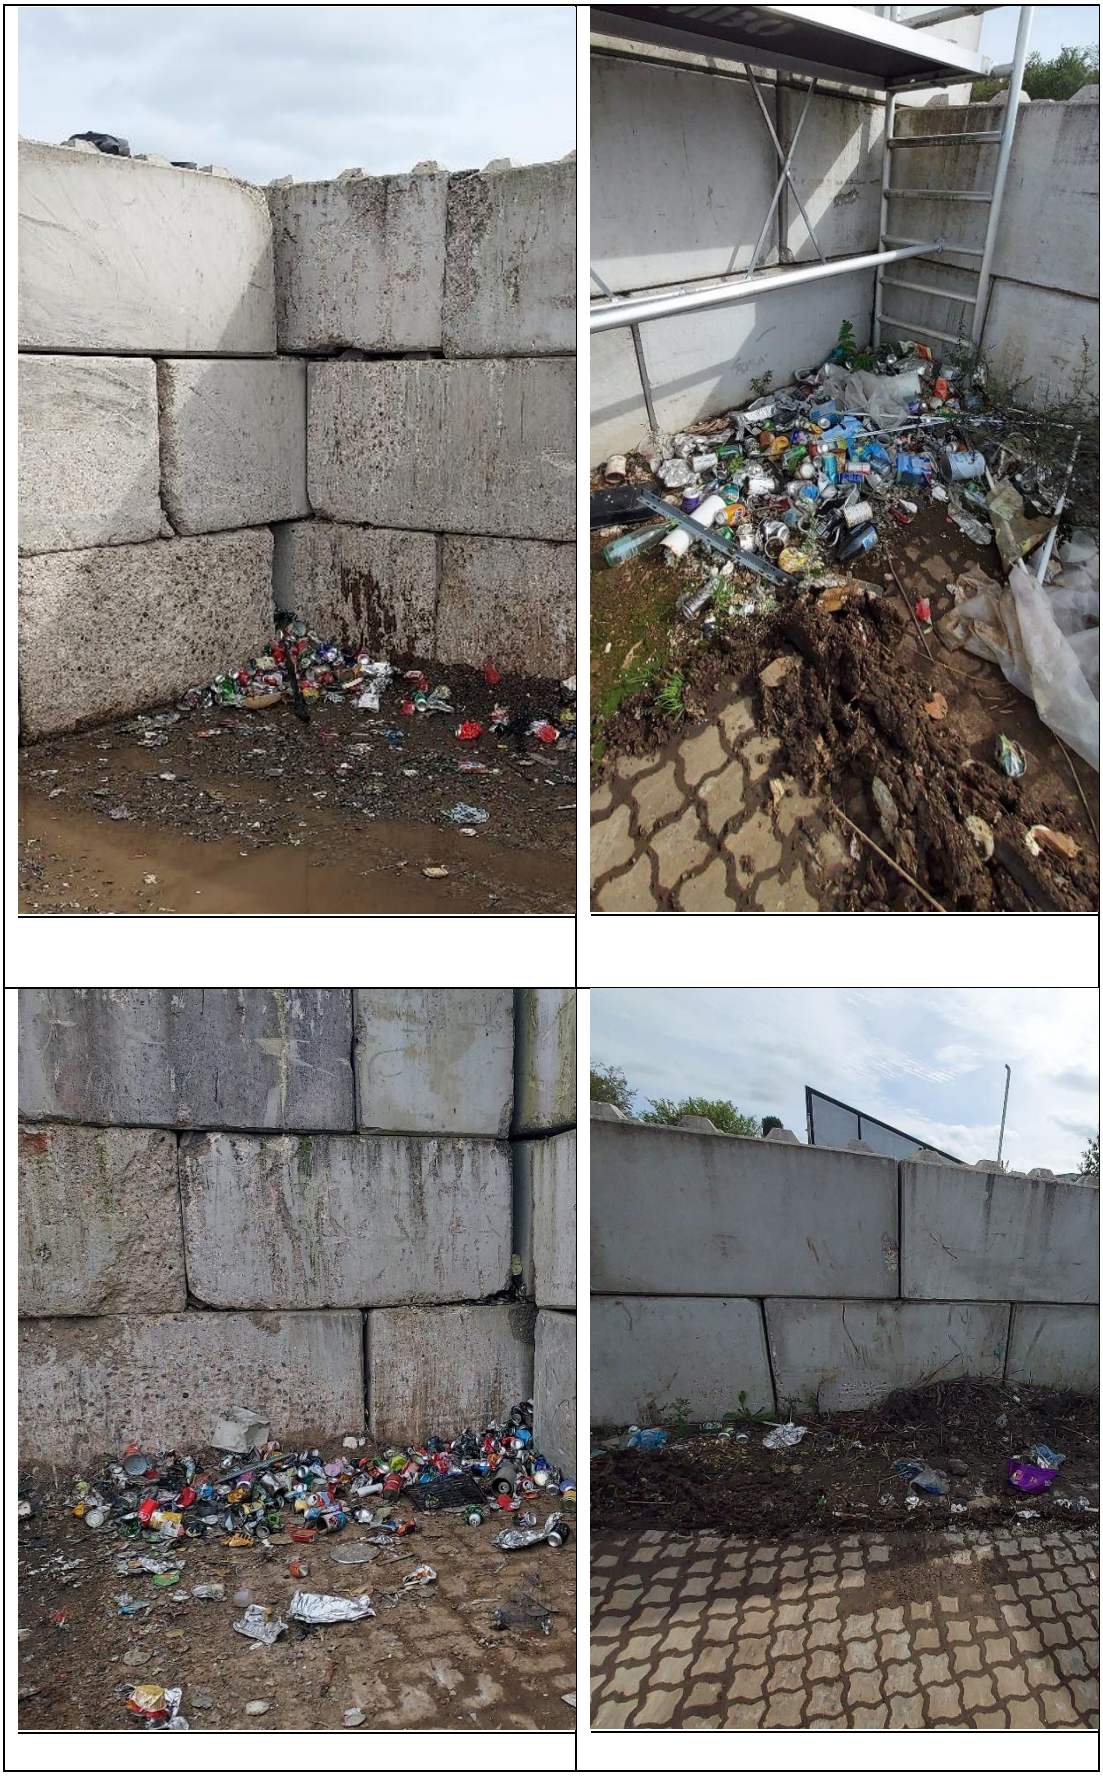

Figur 4. Blokerede afløbskanaler.

Flow af overfladevand mod afløb i sydøstligt hjørne er stadig ikke sikret. Der blev fremvist en ide om at fjerne hjørner i "lego" klodser så afløb kunne sikres, dette var ikke gennemført.



Figur 5. Afløbspunktet for hele pladsen.

Argo oplyste til Miljøstyrelsen d. 12. november 2026, at det ikke kan undgås, at der hele tiden forekommer småt affald og plast samt grus og jord fra lastbilernes dæk på pladsen for neddeling af brændbart affald, som ved kraftig regn skylles ned over pladsen og samler sig ved afløbsristen. Argo fremsende til Miljøstyrelsen, billeder som viser at området ved afløbsbrønden på pladsens sydøstlige hjørne blev renholdt og oplyste, at der fejes omkring afløbsristen og bag båsene flere gange om ugen.

Miljøstyrelsen fastholder, at vilkår d1 og G1 i miljøgodkendelse af 9. september 2025 om afledning af spildevandvand og vedligehold af belægning skal overholdes.
Miljøstyrelsen kan konstatere, at indskærpelsen af vilkår D1 og vilkår G1 i miljøgodkendelse af 9. september 2025 om afledning af vand, af 2. juli 2026, fortsat ikke er efterkommet.
Det er miljøstyrelsens opfattelse at den manglende rensning/vedligeholdelse af afløbskanalerne mellem båsene og ved afløbsristen forhindrer overholdelse af vilkår D1 og vilkår G1 i miljøgodkendelse af 9. september 2025 om afledning af vand.

<u>Opfølgning på indskærpelse af vilkår E1 i miljøgodkendelse af 9. september 2025, samt vilkår 3.14 og vilkår 3.25 i revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005, om forebyggelse af papir og plastflugt og opsamling af affald, af 2. juli 2026.</u>

Ved tilsynet var påbegyndt oprensning af grøft (bevoksning), syd og vest for sorteringsplads, der var dog ikke ryddet helt op endnu. Det ser ikke ud som om der er sket opsamling af affald, men mere at affald er dækket/indbygget i grøften.
Affaldspladsen fremstår mere rodet end på tilsyn i juni 2026.


Argo oplyste til Miljøstyrelsen den 12. november 2026, at det ikke kan undgås, at der hele tiden fremkommer småt affald og plast fra neddelingen af brændbart affald, som kan flyve rundt på pladsen og forventer at kunne holde det flyvske affald inde på pladsen efter den kommende etablering af 5 meter højt hegn, som skråner indad foroven.


Miljøstyrelsen gør opmærksom på at virksomheden er forpligtet til at opsamle affald der spildes på affaldshåndteringspladsen, samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder i henhold til vilkår E1 i miljøgodkendelse af 9. september 2025.


Derudover gør Miljøstyrelsen opmærksom på at jf. vilkår 3.14 og vilkår 3.25 i Revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005, skal risikoen for plast- og papirflugt fra det samlede anlæg minimeres mest muligt, således at vindflygtigt affald ikke spredes på og uden for anlægget. Desuden skal både neddelt og ikke-neddelt forbrændingsegnet affald kompakteres løbende og ved hver arbejdsdags afslutning. Papir- og plastflugt fra forbrændingsegnet affald, skal forebygges ved opbevaring under net eller i hal.

Miljøstyrelsen kan konstatere, at indskærpelsen af vilkår E1 i miljøgodkendelse af 9. september 2025, samt vilkår 3.14 og vilkår 3.25 i Revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005, om opsamling af affald, af 2. juli 2026 ikke er efterkommet.


Til opfølgning herpå, skal Argo fremsende til Miljøstyrelsen, driftsinstruksen jf. vilkår 14.6 hvor der detaljeret beskrives hvorledes risikoen for plast- og papirflugt søges minimeret og hvorledes den daglige drift tilrettelægges, således at vindflygtigt affald ikke spredes på og uden for anlægget.

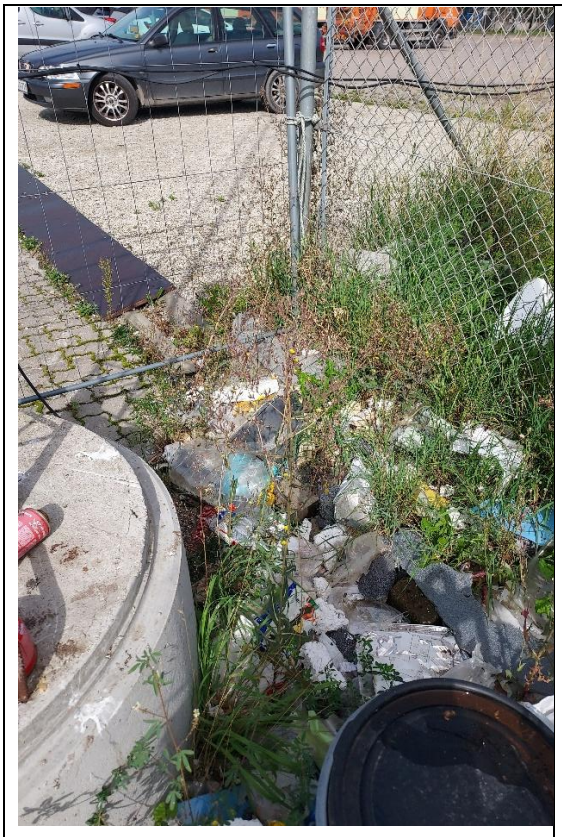

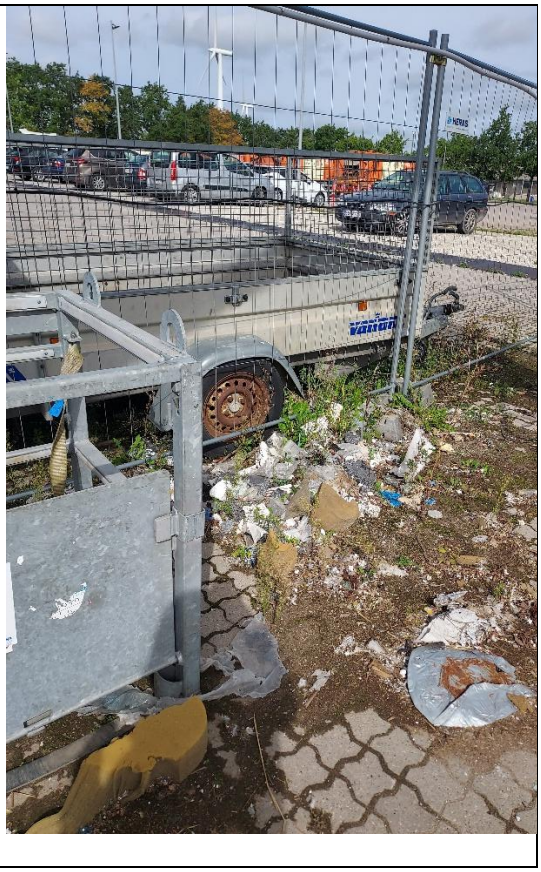

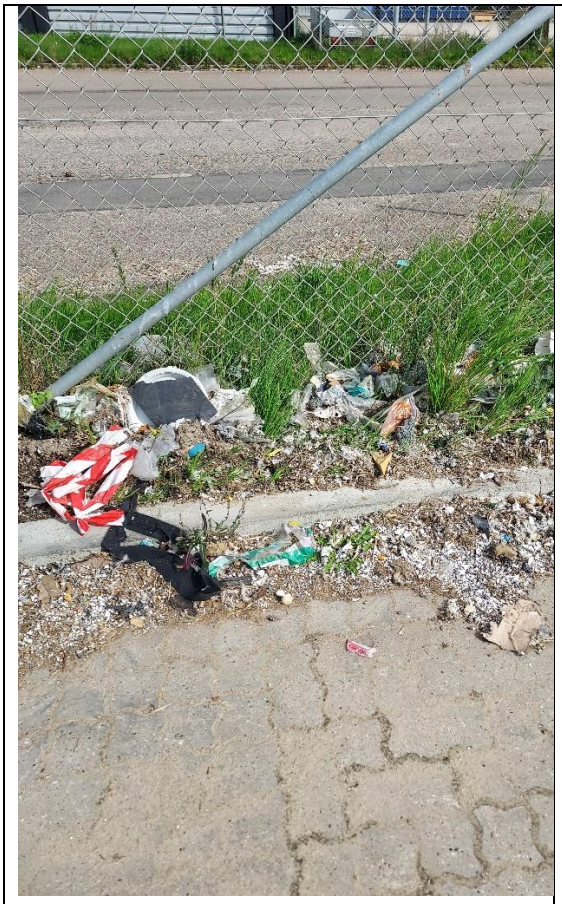



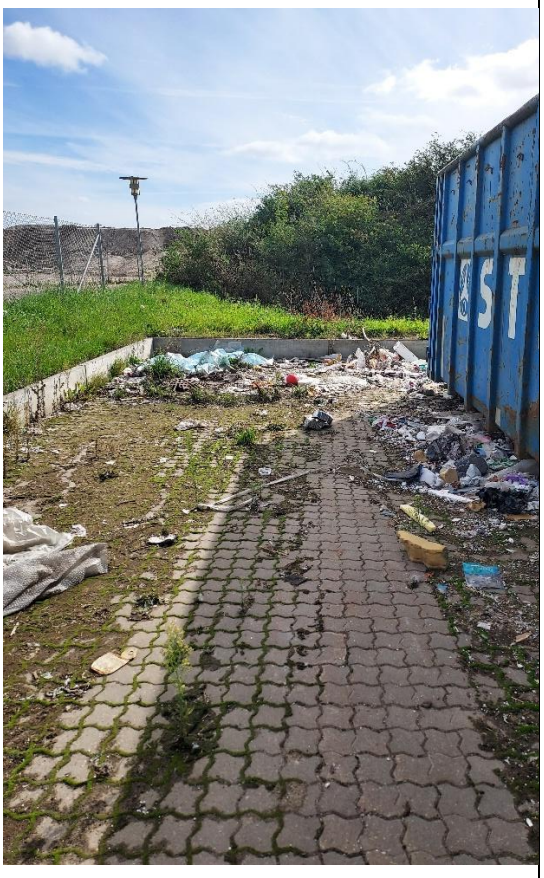





Figur 6. Flyvende affald.

Opfølgning på indskærpelse af vilkår 13.3 om indretning samt vilkår 2.7 og vilkår 2.8 om hegn i Revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005, af 2. juli 2026.

Virksomheden har efter Miljøstyrelsens anmodning, den 22. september 2026 fremsendt ordrebekræftelse på hegn til pladsen for neddeling af brændbar samt ny enhed 3. Jf. kontrakten, forventes opgaven at kunne starte i uge 46-47.

Miljøstyrelsen kan konstatere, at indskærpelsen af vilkår 13.3 om indretning samt vilkår 2.7 og vilkår 2.8 om hegn i Revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005, af 2. juli 2026 er i proces.

Opfølgning på indskærpelse af vilkår 6.1 i revurderet miljøgodkendelse af 30. september 2005 om perkolat opsamling, af 2. juli 2026.

På tilsynet blev det oplyst at arbejde med spuling af rørføring mellem brønde og rengøring/spuling af selve drænrørene er igangsat.
Det var ikke helt klart i hvilket omfang arbejdet ville blive udført og om spuling omfatter drænrør eller alene rørføring mellem brønde og forbindelsen mellem disse.
Som opfølgning herpå skal virksomheden fremsende en beskrivelse af det udførte arbejde til Miljøstyrelsen

Notater med resultaterne af spulingen af perkolatdræn mellem inspektions- og samlebrønde på enhederne 1, 2, 4 og 5 blev fremsendet til Miljøstyrelsen d. 12. november 2026.
Argo oplyste til Miljøstyrelsen, at tjek og spuling af drænene på enhed 7 forventes at blive udført i uge 47, og notat herfor vil blive eftersendt.
Afløbsrørene fra samlebrøndene S1, S2, S4, S5 og S7 og frem til perkolatkælderen P1 er spulet og fundet rene tidligere på efteråret.

Miljøstyrelsen kan konstatere, at indskærpelsen af vilkår 6.1 i revurderet miljøgodkendelse af 30. september 2005 om perkolat opsamling, af 2. juli 2026, er i proces.

Opbygning af enhederne 1-2 og 4
På tilsynet blev det oplyst, at enhederne 1-2 og 4 ved etableringen er bygget op ved at der blev påkørt ler horisontalt ud på affaldet efter hver endt arbejdsdag. Det var uklart, om der også var tale om, at blandet affald og ikke kun mineralsk affald blev afdækket dagligt. Hvis blandet affald er horisontalt afdækket, kan det forklare uheldet tidligere i 2026, hvor der løb tydeligt belastet perkolat ud af siden af enhederne 1 og 4.

Hermed Argos kommentarer til ovenstående:
"*Maskinførere, som også arbejdede på Audebo tilbage i tiden under deponering på enhederne 1, 2 og 4, oplyser følgende: At alt affald på de tre enheder dagligt blev afdækket med 20 cm jord (ikke ler).*

Affaldet, som blev deponeret på de tre enheder, bestod af meget blandet affald, også dagrenovation, men ind imellem (særligt på enhed 1) også asbestholdige, hele togtage. Jorden, som blev anvendt til de daglige overdækninger af enhed 1 og 2, kom fra afgravningen af jord på Audebo Miljøcenter ifm. etableringen af enhed 4, mens de daglige overdækninger på enhed 4 kom fra afgravning af jord ifm. etableringen af enhed 5."

Det er Miljøstyrelsen vurdering, at den beskrivende opbygning af de tidligere enheder, med afdækningslag (lerholdigt), kan reducere anlæggets funktion, herunder påvirke


perkolatproduktion. Dette kan evt. forklare vertikal udtrædende perkolat, som oplevet fra enhed 1 og 4 ifm. etablering af enhed 3.

Delelementer af ny enhed 3 kunne beses på tilsyn.



Figur 7. Samme bygning af membran mellem eksisterende enheder og den kommende enhed 3.

Den medarbejder som havde til opgave at sammenføje membranen, tegnede en principskitse for sammenføjning af de eksisterende membraner og den nye celle.

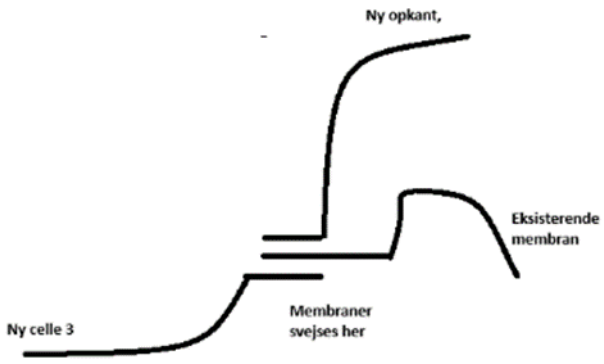

Figur 8. Principskitse.

Andre forhold

Modtagelseskontrol

Ved tilsynet har Miljøstyrelsen konstateret, at modtagelse af evt. farligt uklassificeret affald (glasuld og stenuld) i gipsfraktion på affaldspladsen til deponering.
Dette er ikke i overensstemmelse med virksomhedens procedurer ift. modtagelse og sortering, som beskrevet ved tilsynet i juni 2026.

Som opfølgning hermed skal virksomheden fremsende en redegørelse for hvordan læsset bliver håndteret til Miljøstyrelsen.



Figur 9. Modtagelse af evt. farligt uklassificeret affald (glasuld og stenuld) i gipsfraktion.

Argos kommentarer til ovenstående:
"Det pågældende affald blev læsset af på Audebo Miljøcenters sortererplads, og ikke på affaldsplads til deponering.

Affaldet var ikke deklareret som gipsaffald, men med EAK kode 170904: Blandet byggnings- og nedrivningsaffald.

Affaldet blev ved indvejningen "omklassificeret" til sortering og læsset af på sortererpladsen, da der kunne ses træ i affaldet, hvorved affaldet ikke umiddelbart kunne køres direkte til deponi på enhed 7.
Efter frasortering af træstykker blev resten af læsset (gips og emballeret isolering) kørt til deponi på enhed 7 som mineralsk affald."

Miljøstyrelsen tager Argos kommentarer til efterretning.

Jordhåndtering

På den ubefæstede del af den tidligere haveaffaldsplads, er der midlertidigt placeret jordbunker med overskuds jord/grus fra den kommende enhed 3, jf. virksomhedens jordhåndteringsplan. Blandt jordbunkerne var der en stor bunke af asfalt/asfalt stykker (figur 10).

Som opfølgning herpå skal virksomheden fremsende en redegørelse for hvordan asfalten håndteres til Miljøstyrelsen.

Argos kommentarer til ovenstående:
"Bunken med asfalt/asfaltstykker lå ved tilsynet IKKE på den ubefæstede tidligere haveaffaldsplads, men på et endnu ikke opgravet areal på kommende enhed 3, hvilket billedet også viser.

Asfalten er opgravet / stammer fra et tidligere vejareal ned til den tidligere neddelingsplads for brændbart affald på den kommende enhed 3.
Asfalten er for længst fjernet og bortkørt til godkendt modtager."

Miljøstyrelsen tager Argos kommentarer til efterretning.



Figur 10. Oplag af asfalt.

Vandbeholdere/palletanke

Der blev på tilsynet observeret en del vandbeholdere/palletank på anlæggets sydlig side. Hvad er formålet med disse? Hvad bruges de til?

Argos kommentarer til ovenstående:

"De pågældende palletanke blev i sin tid brugt til opbevaring af perkolat ifm. MUDP-projektet for PFAS- og tungmetalrensning, som foregik på Audebo Miljøcenter i sommeren og efteråret 2023.

Palletankene blev efter projektets afslutning skyllet og perkolatrester samt skyllevand bortskaffet til FORS sammen med øvrigt perkolat og spildevand fra Audebo Miljøcenter.

De nu tomme palletanke vil snarest blive fjernet / bortskaffet."

Miljøstyrelsen ønsker at blive orienteret, når palletanke er fjernet.



Figur 11. Oplag af vandbeholdere.

Opsummering:

Det er på tilsynet konstateret, at følgende indskærpelser af 2. juli 2026, ikke er efterkommet:

- Indskærpelse af vilkår 3.32 i revurderet miljøgodkendelse af 30. september 2005 om opbevaring af frasorteret farligt affald.
- Indskærpelse af vilkår D1 og vilkår G1 i miljøgodkendelse af 9. september 2025 om afledning af vand
- Indskærpelse af vilkår E1 i miljøgodkendelse af 9. september 2025, samt vilkår 3.14 og vilkår 3.25 i revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005, om forebyggelse af papir og plastflugt og opsamling af affald

Efterkommelse af følgende indskærpelser af 2. juli 2026 er igangsat hos virksomheden:

1) Indskærpelse af vilkår 6.1 i revurderet miljøgodkendelse af 30. september 2005 om perkolat opsamling
2) Indskærpelse af vilkår 13.3 om indretning samt vilkår 2.7 og vilkår 2.8 om hegn i Revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005

Følgende indskærpelser vurderes efterkommet efter tilsynet d. 14. september 2026.

1) Indskærpelse af §40 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen om håndtering af frasorteret elektrisk og elektronisk affald (EE-affald) af 2. juli 2026

Miljøstyrelsen følger op på indskærpelserne med evt. nyt tilsyn.

Opfølgning
Audebo bedes fremsende følgende til Miljøstyrelsen:

- En redegørelse af hvordan deponeringspraksis har været for enhederne 1-2 og 4, herunder hvordan disse enheder er etableret og bygget op.
  Modtaget d. 12. november 2026.

- En redegørelse for hvordan læsset af evt. farligt uklassificeret affald (glasuld og stenuld) i gipsfraktion på affaldspladsen til deponering blev håndteret.
  Modtaget d. 12. november 2026.

- På den ubefæstede del af den tidligere haveaffaldsplads, er der midlertidigt placeret jordbunker med overskuds jord/grus fra den kommende enhed 3, jf. virksomhedens jordhåndteringsplan. Blandt jordbunkerne var der en stor bunke af asfalt/asfalt stykker (figur 10).
  Modtaget d. 12. november 2026.

- En redegørelse for hvordan asfalten, der midlertidigt var placeret på den ubefæstede del af den tidligere haveaffaldsplads, er blev håndteret.
  Modtaget d. 12. november 2026.

- En redegørelse for de observerede vandbeholdere/palletanke, herunder hvad formålet med disse er? Hvad de bruges til?
  Modtaget d. 12. november 2026.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.
