Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1953
Ref. MAPOU/LONNI
Dato: 16.11.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Ubberup Losseplads
Virksomhedens adresse	Holbækvej, 4400 Kalundborg
CVR nummer	29189595
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	8.10.2026
Baggrunden for tilsynet	Opfølgende tilsyn, anmeldt
Varsling af tilsynet	8. oktober 2026
Deltagere fra virksomheden	Hjalte Jensen Kalundborg Kommune og Levent Kara, Kalundborg Kommune
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Martin Poulsen og Lone Nielsen
Tilsynet omfattede	Gennemgang af indskærpelser fra tilsyn 28. maj 2026
Materiale udleveret	

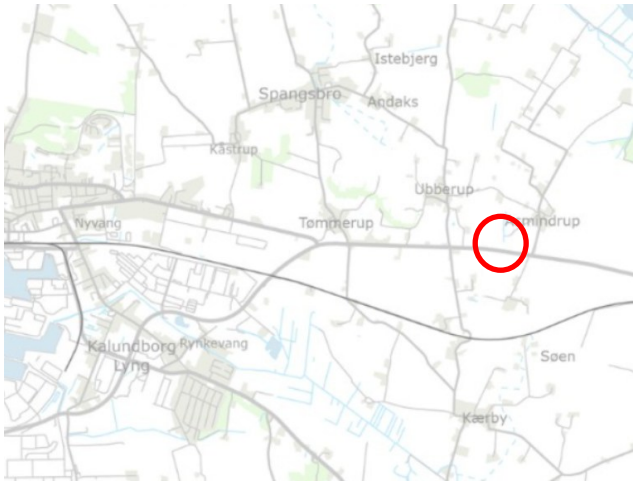

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
06-02-2020	Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens §§ 41, stk. 1 og 72, stk. 3	Påbud om at 1) reetablere grundvandsmoniteringsboringer, 2) screene perkolatet og 3) opstille forslag til nyt moniteringsprogram for perkolat og grundvand, 4) undersøge og sikre perkolat bassinets tæthed, 5) undersøge og sikre tilstrækkelig afledning af perkolat fra lossepladsen. Punkt 1), 2), 4) og 5) er opfyldt. Punkt 2) 3) er ikke opfyldt og der gives en indskærpelse for dette.
29-08-2023	Påbud efter miljøbeskyttelses-lovens § 72, stk. 3	Påbud om supplerende vilkår for egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med perkolat og grundvand på Ubberup Losseplads
26-09-2023	Indskærpelse	Indskærpelse af punkt 3) i påbud af 6-2-2020: Virksomheden skal opstille forslag til nyt moniteringsprogram for perkolat og grundvand.
08-06-2026	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår 5.3 i vilkårsændring af 10. april 1995 skal bortledte perkolatmængder registreres. Indskærpet at påbud om retablering af grundvandsboringer til overvågning af Ubberup Losseplads, screening af perkolat, samt kontrol af opsamling og bortledning af perkolat, efter § 41, stk. 1 og § 72, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven. Ikke er imødekommet. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens §§ 41, stk. 1 og 72, stk. 3 den 6/2 2020 påbudt at det skal sikres at perkolatbassinet er tæt. Det indskærpes at perkolarbehandlingsysstem herunder perkolatbassin skal være tæt. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens §§ 41, stk. 1 og 72, stk. 3 den 6/2 2020 påbudt at undersøge og sikre tilstrækkelig afledning af perkolat fra lossepladsen

		boringer alle skal udføres korrekt som kategori A boring, jf. boringsbekendtgørelsen Det indskærpes at gasproduktion indberettes

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Monitering af perkolat og grundvand	Der er i 2023 gennemført monitering af perkolat og grundvand i henhold til påbud af 6. februar 2020 med henblik på at opstille nyt moniteringsprogram. Der er fremsendt forslag til nyt moniteringsprogram, dog med væsentlige mangler i forhold til grundvandsstrømningsretning. Der er fremsendt analyser for 2021-2022 og 2023 dette indskærpes
Perkolatmængde	Der er fremsendt opgørelser over perkolatmængder i 2017, 2018 og 2019. Se afsnit om perkolat. Der er ikke sendt perkolatmængder for efterfølgende år, dette indskærpes.
Opsamlet gas	Der er fremsendt opgørelser over opsamlede gasmængder fra 2013 til 2019. Se afsnit om gas.

Jordforurening
På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:
- Miljøgodkendelse af 1. oktober 1975
- Forlængelse af virksomhedsgodkendelse til lossepladsdrift på Ubberup kontrollerede losseplads. 16. august 1985, Vestsjællands Amt.
- Vilkårsændring i miljøgodkendelse af 16. august 1985 til Ubberup Losseplads, Kalundborg Kommune. 10. april 1995, Vestsjællands Amt.
- Påbud om retablering af grundvandsboringer til overvågning af Ubberup Losseplads, screening af perkolat samt kontrol af opsamling og bortledning af perkolat, 6. februar 2020, Miljøstyrelsen.
- Påbud om supplerende vilkår for egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med perkolat og grundvand på Ubberup Losseplads 29. august 2023.

Miljøstyrelsens påbud 2020.
Miljøstyrelsen har den 6/2 2020 fremsendt Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens §§ 41, stk. 1 og 72, stk. 3

Påbud omhandler
1) reetablere grundvandsmoniteringsboringer
2) screene perkolatet
3) opstille forslag til nyt moniteringsprogram for perkolat og grundvand
4) undersøge og sikre perkolat bassinets tæthed
5) undersøge og sikre tilstrækkelig afledning af perkolat fra lossepladsen.

Miljøstyrelsen har følgende bemærkninger til opfyldelsen af påbud:

1) Der er etableret 3 nye overvågningsboringer som påviser en grundvandspåvirkning.
2) Der er fremsendt analyser af perkolat 2021 og 2022 og 2023
3) Der er fremsendt et ufuldstændigt forslag til moniteringsprogram, idet bla. strømningsretning ikke er fastlagt
4) Perkolatbassin er i mellemtiden igen utæt
5) Er ikke sket, perkolatbortledning er ikke oplyst

Opfølgende tilsyn den 8. oktober 2026

På tilsynet blev indskærpelser fremsendt 8/6 2026 gennemgået.

Ingen af indskærpelserne er imødekommet på tilsynstidspunktet.

Kalundborg Kommune oplyste, at deres sagsbehandler var stoppet og udbad sig muligheden for at imødekomme indskærpelserne.

Det blev derfor på tilsynet aftalt, at Kalundborg Kommune umiddelbart efter tilsynet svarer på status for indskærpelser.

Basistilsyn den 28. maj 2026 gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Det indskærpes at perkolatmængder oplyses.

Kalundborg kommune har den 6. oktober 2026 fremsendt perkolatopgørelser 2020 til 2026

2. Det indskærpes at der skal gennemføres analyser af grundvand og perkolat

Kalundborg Kommune har den 5. november 2026 fremsendt analyser udtaget af GB101-102-103, indskærpelsen er delvist efterkommet.

3. Det indskærpes at fremsendt undersøgelsesrapport ikke er fyldestgørende

Kalundborg Kommune oplyser den 5. november 2026 at de har indledt et samarbejde med NIRAS om at gennemføre undersøgelser, afgrænse forureningen, fastlægge strømningsretningen, foretage en risikovurdering samt udarbejde et revideret moniteringsprogram for Ubberup Losseplads.

4. Det indskærpes at perkolatbassin skal være tæt




Perkolatbassin virkede kun belastet med regnvand, der var tydeligt flow til kloak, des sås dog ingen misfarvning eller lugt og spildevand bestod sandsynligvis hovedsaligt af regn.

5. Det indskærpes at der foregår en tilstrækkelig afledning af perkolat

6. Der skal fremsendes dokumentation for bortskaffelse af perkolatslam

7. Det indskærpes at boringer alle skal aflåses og mærkes korrekt

Kalundborg Kommune har den 5. november 2026 fremsendt billede af aflåst brønd. Indskærpelse er delvist efterkommet.

8. Overvågning af perkolat på membran/bund skal fungere

9. Det indskærpes at gasproduktion indberettes

Kalundborg Kommune har den 9. oktober 2026 fremsendt opgørelse over gasproduktion som Miljøstyrelsen for nuværende har accepteret

Det er fortsat Miljøstyrelsens opfattelse at procesplanen for at overholde påbudte vilkår er som følger:

- At så vidt som muligt stoppe udsivende perkolat ved at sikre at perkolat afledes via drænsystem til perkolatbassin, ved i praksis at foretage en inspektion og rensning af drænledninger for at sikre de er fungerer optimalt og som oprindeligt planlagt.
  At samle materiale om opbygning af anlægget til at understøtte indsatsen med at vedligeholde perkolatbortskaffelsesanlægget.

- Om muligt etablere en overvågning af perkolat niveau/højde på lermembran

- Perkolatbassin og afledningssystem skal være tæt

- Udbygge Niras rapport så den er fyldestgørende i forhold til påbud af 6/2 2020 og samtidig udgør en risikovurdering af belastningen

- Miljøstyrelsen vil på baggrund af risikovurdering og oplysninger om bortledte perkolatmængder samt overvågning i boringer vurdere om der eventuelt skal udføres afværgeforanstaltning

Kalundborg kommune skal redegøre for hvordan påbudte vilkår overholdes, gerne i en procesplan.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Miljøstyrelsen vil invitere til et møde i december 2026 for at følge op på indsatsen.

Med venlig hilsen
Martin Poulsen
